

PATVIRTINTA/PRITARTA

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

2019-03-08 Nr. JS-452

teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu

Kauno r. sav.

(2017 - 2018)-ŪJŲ METŲ

Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano I pakeitimas TPDR NR.: T00073030

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

I KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO I PAKEITIMAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Išorės aplinkos dalies sprendiniai
2. Urbanistinės dalies sprendiniai
3. Gamtinės aplinkos dalies sprendiniai
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir naudojimas
5. Socialinės aplinkos dalies sprendiniai
6. Susisiekimo dalies sprendiniai
7. Techninės infrastruktūros dalies sprendiniai
8. Vilkija
9. Kulautuva
10. Kačerginė
11. Ringaudai
12. Domeikava

II IŠVADOS

III PROGNOZĖS

IV SIŪLYMAI

V PRIEDAI

I KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO I PAKEITIMAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
1	Išorės aplinkos dalies sprendiniai					2015	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
1.1	Kauno -Vilniaus dvimiesčio plėtojimas					2015	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
1.1.1	Geležinkelio atkarpos „Vilnius–Kaunas“ sujungimas su Kauno oro uosto terminalu	Geležinkelio atkarpos „Vilnius–Kaunas“ sujungimas su Kauno ir Vilniaus oro uosto terminalais (Įrengtas elektrifikuoto geležinkelio ruožas Karmėlava–Pravieniškės (apie 11,5 km))	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Nepradėta vykdyti		Geležinkelio atkarpos "Vilnius - Kaunas" sujungimo su Kauno oro uosto terminalu projekte AB "Lietuvos geležinkeliai" vertina Kauno geležinkelio mazgo plėtros galimybes ir alternatyvas, siekiant maksimalios sinergijos tarp sąlyginai nedidelėje teritorijoje planuojamų Kauno oro uosto plėtros, Rail Baltica ir Kauno LEZ projektų. Vertinimo procesas susijęs su 2018 m. rugpjūčio mėn. LR vyriausybės priimtu sprendimu Kaune statyti naują keleivinį terminalą, kuris bus integruotas su "Rail Baltica" geležinkelio linija, įrengiant požeminę traukinio stotį. Taip pat buvo priimtas nutarimas Kauno oro uoste plėtoti lėktuvų remonto ir

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
1.1.1	Geležinkelio atkarpos „Vilnius–Kaunas“ sujungimas su Kauno oro uosto terminalu	Geležinkelio atkarpos „Vilnius–Kaunas“ sujungimas su Kauno ir Vilniaus oro uosto terminalais (Įrengtas elektrifikuoto geležinkelio ruožas Karmėlava–Pravieniškės (apie 11,5 km))	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Nepradėta vykdyti		techninės priežiūros veiklas.
1.1.2	Modernizuoti geležinkelio ruožo Vilnius–Kaunas infrastruktūrą	Padidėjęs susisiekimo greitis iki 160 km/h bei pagerėjęs eismo saugumas geležinkelio ruože Kaišiadorys – Kaunas.	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Europos Sąjungos paramos lėšos		2015	2020	Vykdoma		Parengtas techninis projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Projekto įgyvendinimas atidėtas iki 2020 metų.
1.2	Kauno kaip aplinkinio Baltijos regiono ir Lietuvos Respublikos pramonės,					2016	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
1.2.1	Keleivinio ir krovininio vandens transporto vystymas	Parengta studija sukurta - Nemuno vandens kelio E 41 infrastruktūra.	Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė	Kita		2017	2019	Vykdoma		Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto "Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas" komisija koncesijos suteikimui organizuoti ir koncesijos suteikimo procedūroms atlikti (toliau - Komisija) bendru sutarimu nutarė, kad Koncesijos krovininės prieplaukos infrastruktūra, paskelbtas Marvelės krovininės prieplaukos koncesijos konkursas. Kitų paraiškų iki nustatyto termino 2016 m. iš Koncesijos konkurso dalyvių gauta nebuvo. Keleivių gabenimui vandens transportu turizmo sezono metu vykdomi maršrutai Kaunas-Kačerginė (pagal individualius užsakymus); Nemunu/Nevėžiu: Kaunas-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
1.2.1	Keleivinio ir krovinio vandens transporto vystymas	Parengta studija sukurta - Nemuno vandens kelio E 41 infrastruktūra.	Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė	Kita		2017	2019	Vykdoma		Raudondvario dvaras-Kaunas (reguliarus reisas sekmadieniais ir pagal individualius užsakymus).
1.2.2	Transporto plėtra ir modernizavimas Kauno priemiesčiuose	Parengta studija - parengtas transporto plėtros ir modernizavimo planas	Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė	Valstybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Kauno priemiesčiuose vyksta transporto infrastruktūros plėtros ir kokybės gerinimo procesas, plėtojama infrastruktūra įvairiarūšio transporto naudojimui (vykdoma dviračių tinklo infrastruktūros plėtra, jungčių su Kauno miestu užtikrinimas) ir gerinamos kokybinės ir eismo saugos priemonės pėsčiųjų eismui.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Bendrajame plane sprendiniais ir rajono vystymo priemonėmis siekiama panaudoti esamą susisiekimo infrastruktūrą, užtikrinti alternatyvias galimybes keliauti: vykdomas esamos susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo procesas, kuriama būtinoji infrastruktūra alternatyvaus transporto naudojimui – įrengiamas susisiekimui dviračiais transportu tinklas, kuriant ryšius su Kauno miesto teritorija.

Vykdoma keleivinio vandens transporto infrastruktūros ir paslaugų plėtra: įrengta mobili prieplauka Kulautuvoje, vykdomos pėsčiųjų ir dviratininkų perkėlimo paslaugos Zapyškis-Kulautuva-Zapyškis, turizmo ir rekreacijos tikslais vykdomos keleivių gabenimo vandens transportu paslaugos Kauno mariose, kt. maršrutais, susijusiais su Kauno miesto savivaldybe (Kaunas – Kačerginė, Kaunas-Raudondvario dvaras). Viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2017 m. veiklos ataskaitos duomenimis 2017 m. kelionių vandens transportu buvo atlikta 60 proc. daugiau nei 2016 m.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Lėtai vykstantys geležinkelio transporto infrastruktūros modernizavimo ir plėtros darbai:

Atkarpos "Vilnius - Kaunas" sujungimo su Kauno oro uosto terminalu priemonė nepradėta vykdyti, ir negali būti savarankiškai įgyvendinama dėl besitęsiančių susijusių valstybinės svarbos ir kt. projektų įgyvendinimo: Rail Baltica, Kauno LEZ, Kauno oro uosto plėtros projektų. Sprendžiamos Kauno geležinkelio mazgo plėtros galimybės bei alternatyvos, integruojant Kauno keleivinį terminalą į Rail Baltica geležinkelio liniją.

Vilnius-Kaunas infrastruktūros modernizavimo (rezultatai – didesnis greitis, pagerėjusi eismo sauga) procesui pradėti – parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau Lietuvos geležinkelių teikta informacija, projekto įgyvendinimas atidėtas iki 2020 metų. Kadangi priežastys nežinomos, daroma prielaida, kad šiuo metu didžiausias dėmesys nukreiptas į valstybei svarbių projektų įgyvendinimą - Rail Baltica geležinkelio linijos realizavimą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
2	Urbanistinės dalies sprendiniai					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
2.1	Normatyviniai ir kiti planavimo apribojimai bei reikalavimai					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
2.1.1	Reglamentuoti esamų sodų konversiją į gyvenamąsias teritorijas	Parengti kelis kompleksinio (detaliojo) teritorijų planavimo dokumentus, kad pradėti įgyvendinti sodų konversiją	Savivaldybės Urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Nepradėta vykdyti		Planuojama parengti kelis kompleksinio (detaliojo) teritorijų planavimo dokumentus
2.2	Erdvinė struktūra					2015	2017	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
2.2.1	Kurortinės vietovės Kulautuvoje, Kačerginėje ir Zapyškyje įteisinimas	Parengti specialiuosius miestelių ribų nustatymo planus, parengti kurortinės vietovės Kulautuvoje, Kačerginėje ir Zapyškyje specialųjį planą, gauti kurortinės vietovės statusą Kulautuvos, Kačerginės ir Zapyškio teritorijai	Savivaldybės Urbanistikos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2017	Igyvendinta	2017-02-22	Kulautuvai, Kačerginei ir Zapyškio miestelio daliai suteiktas kurortinės teritorijos statusas 2017 m. vasario 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.121.
2.3	Gyvenviečių sistema, plėtros teritorijų formavimas ir žemės naudojimo					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
2.3.1	Vietinių centrų tinklo teritorijos (U4) plėtojimas	Parengti 3 kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai (bendrieji planai – Garliavos m., Raudondvario k. ir Karmėlavos mstl.)	Savivaldybės Urbanistikos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Nepradėta vykdyti		Planuojama parengti Garliavos m., Raudondvario k. ir Karmėlavos mstl. bendruosius planus
2.3.2	Teritorijų naujų miestelių kūrimui (U3) plėtojimas	Žemės valdytojų iniciatyva parengti 6 kaimynų grupių, kvartalų, kompleksų išplanavimo projektai	Savivaldybės Urbanistikos skyrius	Kita		2014	2019	Vykdoma		Parengti 5 kaimynų grupių, kvartalų, kompleksų išplanavimo projektai (2016 m.). Rengiami 2 išplanavimo projektai, dar nepatvirtinti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
2.3.3	Neprioritetinės plėtros kaimų (U6) teritorijos vystymas, išnaudojant esamame užstatyme laisvus sklypus ir remiantis nepertraukiamo, kompaktiško užstatymo principu	Parengti dokumentai pagrindinės žemės naudojimo paskirties, leidžiančios gyvenamąją statybą, pakeitimui	Savivaldybės Urbanistikos skyrius	Kita		2014	2019	Vykdoma		Daliai (U6) teritorijoje esančių sklypų jau pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: 55 sklypams.
2.3.4	Stambių daugiafunkcinių gyvenamųjų kompleksų teritorijos (U5) plėtra iki 2019 m.	Žemės valdytojų iniciatyva parengti 3 stambaus komplekso išplanavimo projektai	Savivaldybės Urbanistikos skyrius	Kita		2014	2017	Igyvendinta		Parengti ir patvirtinti dar 3 stambaus kompleksinio išplanavimo projektai
2.3.5	(U5) teritorijos besiribojančios su užstatyta teritorija, turinčia centralizuotus tinklus, plėtra iki 2019 m	Parengti dokumentai pagrindinės žemės naudojimo paskirties, leidžiančios gyvenamąją statybą, pakeitimui	Savivaldybės Urbanistikos skyrius	Kita		2014	2019	Vykdoma		Daliai sklypų, esančių (U5) teritorijoje, pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: 117 sklypų.
2.3.6	Esamų linijinių struktūrų plėtros teritorijų (U7) plėtojimas, tankinant esamą užstatymą	Parengti dokumentai pagrindinės žemės naudojimo paskirties, leidžiančios gyvenamąją statybą, pakeitimui	Savivaldybės Urbanistikos skyrius	Kita		2014	2019	Vykdoma		Daliai sklypų, esančių (U7) teritorijoje, pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: 80 sklypų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim- o data	Rezultato aprašymas
2.3.7	Esamų tinklų pasiekiamumo zonoje (ne toliau kaip 100 m iki esamo užstatymo) esančios teritorijos (U8) plėtojimas	Parengti dokumentai pagrindinės žemės naudojimo paskirties, leidžiančios gyvenamąją statybą, pakeitimui	Savivaldybės Urbanistikos skyrius	Kita		2014	2019	Vykdoma		Daliai sklypų, esančių (U8) teritorijoje, pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis. Šiai dienai nėra įrankio ir galimybės nustatyti žemės naudojimo paskirties keitimų masto.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Patikslinus Kačerginės, Kulautuvos ir Zapyškio miestelio ribas, įteisintas kurortinės teritorijos statusas Kačerginės, Kulautuvos mstl. ir Zapyškio mstl. daliai.

Kurortinės teritorijos įprasminimui teritorijoje vykdoma turistinių ir rekreacinių paslaugų pasiūla keleiviniu vandens transportu, skatinami darnaus judėjimo principai: įrengtos gyvenamųjų teritorijų jungtys susisiekimui dviračiais su Kauno miestu, kitomis gyvenamosiomis vietovėmis.


Vykdomas procesas atitinka racionalios urbanistinės plėtros įgyvendinimą ir strategiją rajono U3 ir U5 teritorijose (plėtojama iki 2019 metų), skatinant ir užtikrinant teritorijų plėtros kompaktiškumą yra patvirtinti stambaus komplekso (50-150 ha, 50-60 namų grupė) konceptualieji vystymo planai, iš anksto planuojant viešiesiems poreikiams reikiamos infrastruktūros plėtrą.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nepradėti rengti ir neapibrėžti sodų teritorijų vystymo principai: neparengti dokumentai sodų teritorijų konversijos sąlygoms.

Nepradėtas vykdyti vietinių centrų: Garliavos, Raudondvario ir Karmėlavos miestelių, kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesas.

Bendrajame plane dalis urbanizuojamų teritorijų yra numatytos potvynių užliejamose teritorijose.

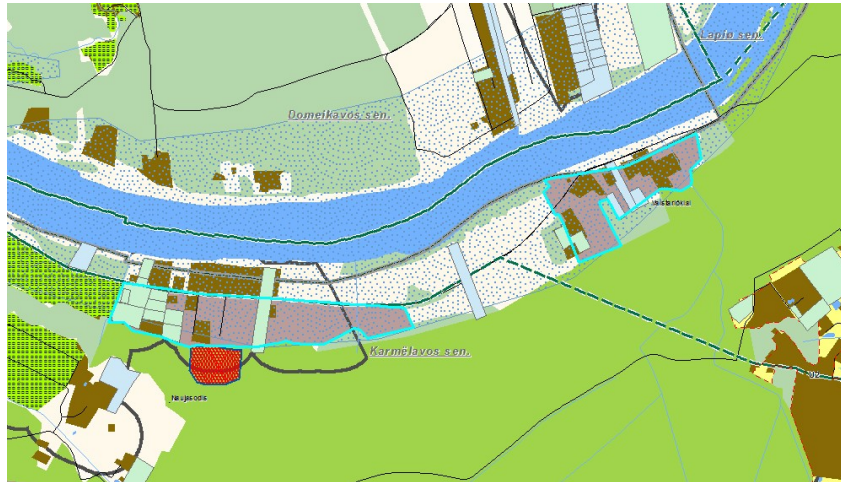

Urbanizuojamos ter. galimų potvynių teritorijose

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3	Gamtinės aplinkos dalies sprendiniai					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 12 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 18		
3.1	Ekologinės apsaugos priemonės					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
3.1.1	Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas	Bus dalinai parengtas ribų planas	Kauno marių regioninio parko direkcija (Kauno marių RPD)	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2016	Igyvendinta	2016-08-11	Patvirtintas LR Vyriausybės 2016-08-11 nutarimu Nr. 829 Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas.
3.1.2	Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas	Bus parengtas Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas, kuriame bus numatytos gamtos apsaugos kryptys ir galimybės	Kauno marių RPD	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2016	Igyvendinta	2016-09-19	Patvirtintas LR aplinkos ministro 2016-09-19 įsakymu Nr. D1-624 Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim- o data	Rezultato aprašymas
3.1.3	Piliunos botaninio-zoologinio draustinio gamtotvarkos planas	parengta pagrindžiamoji informacija	Kauno marių RPD	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Rengiama pagrindžiamoji informacija, tačiau negautas finansavimas
3.1.4	Kamšos miško gamtotvarkos planas	Parengta pagrindžiamoji informacija	Kauno marių RPD; Kauno RAAD; Kauno KPD	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Vietoj gamtotvarkos plano yra rengiami Kamšos valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų ir tvarkymo planai (2018-2019 m.). Planai tvirtinimo stadijoje.
3.1.5	Biojvairovės išsaugojimas naikinant invazines augalų rūšis	Įgyvendinama invazinio augalo Sosnovskio barščio naikinimo ilgalaikė programa	Savivaldybės Aplinkos skyrius	Europos Sąjungos paramos lėšos		2017	2019	Vykdoma		Įgyvendinama invazinio augalo Sosnovskio barščio naikinimo ilgalaikė programa: invazinio augalo naikinimo procesas atliktas Vandžiogalos, Ringaudų, Taurakiemio, Karmėlavos, Domeikavos, Raudondvario, Čekiškės, lapių, Alšėnų, Vilkijos, Akademijos ir Garliavos seniūnijose.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.1.6	Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas seniūnijose	Įrengtos 211 stacionarios aikštelės atliekų konteineriams	Savivaldybės Aplinkos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Įrengta 110 antžeminių konteinerių aikštelių
3.1.7	Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas	Parengti 1 užterštų teritorijų tvarkymo planai, sutvarkytos numatytos teritorijos	Savivaldybės Aplinkos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Patikslintas buvusios karinės teritorijos naftos bazės ir technikos kiemo Karmėlavoje, Oro uosto g. 4, tvarkymo planas. Pradėtas įgyvendinti projektas „Buvusios karinės teritorijos Kauno rajono savivaldybės, Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4 sutvarkymas“
3.2	Aplinkosaugos priemonės sudarysiančios geresnes sąlygas rekreacijai					2015	2019	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.2.1	Vandens telkinių valymas, neeksploatuojamų karjerų (Digrių k., Rašnavos k., Šatijų k., Šilelio k., Ringovės k., Vilemų k., Kazimieravos k., Besmerčių k., Kvesų k.) sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	Pateikta paraiška įtraukti numatytus vandens telkinius į Valstybinių pažeistų žemių 2014-2019 m. tvarkymo planą, parengti techniniai projektai, sutvarkytos numatytos teritorijos	Savivaldybės Aplinkos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Uždarytas Digrių sąvartynas, valomi vandens telkiniai
3.2.2	Maišiaus upelio, jo krantų ir pakrančių sutvarkymas	Išvalytas Maišiaus upelis, tvenkinys ir pakrantės	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Kita		2016	2018	Igyvendinta		Maišiaus upelis, Garliavos II tvenkinys ir pakrantės išvalyti, pritaikyta rekreacijai (Garliavos m. Kaimynystės parko teritorija)
3.3	Gamtinis karkasas ir kraštovaizdis					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini- mo pradžia	Igyvendini- mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim- o data	Rezultato aprašymas
3.3.1	Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenvietės sutvarkymas ir pritaikymas lankymui	Parengtas Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenvietės sutvarkymo techninis projektas	Kauno marių RPD; Kauno RAAD; Kauno KPD	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Parengtas Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenvietės sutvarkymo ir pritaikymo lankymui projektas, rangos darbų pabaiga planuojama 2019 m. II ketv. viduryje.
3.3.2	Samylų piliakalnio su gyvenvietės sutvarkymas ir pritaikymas lankymui	Parengtas Samylų piliakalnio su gyvenvietės sutvarkymo projektas. Piliakalnis pritaikytas rekreacijai.	Kauno marių RPD	Kita		2015	2018	Igyvendinta		Parengtas Samylų piliakalnio su gyvenvietės sutvarkymo projektas, piliakalnis pritaikytas lankymui (įrengti laiptai)
3.3.3	Kauno tvirtovės pritaikymas pažintiniam turizmui	Pradėti turistinių maršrutų sutvarkymo darbai, edukacinė veikla.	Turizmo informacijos centras, Kauno m. sav. administracija. Kauno r. sav. administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		III forto (Seniavos k., Garliavos apyl. sen.) kareivinėse atidaryta edukacinė erdvė. Fortuose vedamos ekskursijos ir edukacinės programos. Siūlomi maršrutai dviračiais „Kauno fortų žiedas“, ekskursija „Pažintinis kelias III ir IV fortai“ ir kt.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.4	Turizmas ir rekreacija					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.4.1	Kauno rajono savivaldybės dviračių takų plėtra	1. Dviračių tako Šilelis–Kulautuva įrengimas. 2. Dviračių tako Kačerginė–Zapyškis įrengimas. 3. Dviračių tako Akademijos mstl.-Kačerginė įrengimas. 4. Dviračių takų jungtys su Kauno miestu (nuo Karmėlavos mstl., nuo Girionių k. ir nuo Šilelio k. ir kt.).	Savivaldybės administracija; Lietuvos automobilių kelių direkcija	Kita		2014	2019	Vykdoma		Įrengti dviračių takai: 6 km Šilelio k. - Kulautuvos mstl. jungtis; Akademijos mstl. - Kačerginės mstl. jungtis; dviračių takai Karmėlavos mst. - Baldininkų g., Kauno m. - Garažų g. (Narėpų g.), Kauno m. - Girionių k., Kauno m. - Garliavos m. Vykdomi dviračių takų įrengimo darbai: Kačerginė - Zapyškis; valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 232 Vilijampolė–Žeimiai–Šėta ruožo nuo 2,640 iki 8,567 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, numatoma darbų pabaiga 2019 m. IV ketv. pabaiga (Kauno m. - Lapių mstl.). Planuojama įrengti susisiekimo dviračiais infrastruktūra: 1 km atkarpą nuo esamo Šilelio k. - Kulautuvos mstl. dviračių tako iki sodų bendrijos „Kernavė“;

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.4.1	Kauno rajono savivaldybės dviračių takų plėtra	1. Dviračių tako Šilelis–Kulautuva įrengimas. 2. Dviračių tako Kačerginė –Zapyškis įrengimas. 3. Dviračių tako Akademijos mstl.-Kačerginė įrengimas. 4. Dviračių takų jungtys su Kauno miestu (nuo Karmėlavos mstl., nuo Girionių k. ir nuo Šilelio k. ir kt.).	Savivaldybės administracija; Lietuvos automobilių kelių direkcija	Kita		2014	2019	Vykdoma		Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo nuo 8,845 iki 12,55 km rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką - parengtas techninis projektas (Garažų g. (Narėpų k.)-Baldininkų g. (Karmėlavos mstl.)).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim- o data	Rezultato aprašymas
3.4.2	Keleivinio lino keltuvo per Nemuną tarp Zapyškio ir Kulautuvos įrengimas	Keleivinio lynų kelio su keleivių įlaipinimo -išlaipinimo terminalu techninio projekto parengimas, įgyvendinimas ir sklaida	Savivaldybės administracija; Turizmo ir verslo informacijos centras	Kita		2016	2019	Nepradėta vykdyti		Keleivių (pėsčiųjų ir dviratininkų) kėlimas Zapyškis-Kulautuva-Zapyškis vykdomas vandens transportu. Tam tikslui įrengta mobili prieplauka Kulautuvoje (šalia karjero). Keltuvo įrengimo klausimas atidėtas vėlesniam laikui, vystantis kurortinėse teritorijose turizmo ir rekreacijos paslaugų įvairovei ir stebint augančius keleivių kėlimo poreikius.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.4.3	Vandens turizmo trasų Kauno rajono upėmis sukūrimas ir plėtra Kauno rajone	1. Įrengta Kačerginės prieplauka, sukurtas maršrutas, užtikrinta sklaida 2. Mažųjų laivų prieplaukos ir infrastruktūros Šilelio kaime, Raudondvario seniūnijoje investicinio ir techninio projektų parengimas	Savivaldybės administracija, Turizmo ir verslo informacijos centras; seniūnija.	Kita		2014	2019	Vykdoma		Įrengta nauja mobili prieplauka Kulautuvoje (prie Kulautuvos karjero), sudarytos sąlygos efektyvesniam pėsčiųjų ir dviratininkų perkėlimui per Nemuną maršrutu Zapyškis-Kulautuva-Zapyškis. Turizmo sezono metu vykdyti maršrutai: Nemunu, Nemunu/Nevėžiu, Kauno mariose.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.4.4	Rekreacinių ir kurortinių vietovių infrastruktūros plėtra	Rekreacinių poilsio zonų įrengimas: Garliavos kaimynystės parkas, skveras Garliavos m. Maironio/Alyvų g.; Ramučių parko projektas; Voškonių parkas; Linksmakalnio parkas; rekreacinė teritorija: Paraželių k., Rokų sen.; paplūdimys prie Neveronių tvenkinių; Neveronių sveikatingumo parko plėtra; parko Parko g. Dievogalos, Zapyškio sen. rekonstrukcija; rekreacinės zonos Šilelio k. teritorijos planavimo darbai; Ažuolų skveras M. Valančiaus g., Raudondvario k.; Ledos g. Užliedžių k. poilsio zona.	Savivaldybės administracija, Turizmo ir verslo informacijos centras	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Įrenginėjamos rekreacinės poilsio zonos: Kaimynystės parko teritorija, sutvarkius, išvalius Maišiaus upelį ir tvenkinio pakrantes (Garliavos m.); 10 piliakalnių pritaikyta lankymui; rezervuojamos teritorijos visuomenės poreikiams Kulautuvoje (Panemunė), Kačerginėje Biliūno aikštė; vykdomas tvenkinių aplinkos tvarkymo procesas Domeikavos k., Bažnyčios g. ir Eigirgalos k.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
3.4.5	Turistinių trasų maršrutų ir produktų rinkodara ir turizmo ženklavimo infrastruktūros plėtra	Parengtas projektas	Savivaldybės administracija, Turizmo ir verslo informacijos centas	Kita		2015	2019	Vykdoma		TVIC vykdomi e-rinkodaros projektai pagal priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“, bendradarbiaujant su kitos savivaldybėmis/turizmo informacijos centrais: Nemuno kelias, Gynybinio ir gamtos paveldo keliai, Kauno marių ir Nemuno kilpų turizmo e-rinkodara“. Pagrindinės priemonės : turinio rinkodara, mobili rinkodara, internetinės svetainės kūrimas ir administravimas, reklama paieškos sistemose, reklama internetiniuose portaluose, socialinė komunikacija. Šiuo metu baigiamos kurti projektų svetainės ir mobilios aplikacijos, jau parengti objektus pristatantys tekstai, vaizdinė, garsinė medžiaga. Pasirašoma

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini- mo pradžia	Igyvendini- mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim- o data	Rezultato aprašymas
3.4.5	Turistinių trasų maršrutų ir produktų rinkodara ir turizmo ženklavimo infrastruktūros plėtra	Parengtas projektas	Savivaldybės administracija, Turizmo ir verslo informacijos centas	Kita		2015	2019	Vykdoma		finansavimo sutartis dėl projekto „Kauno miesto ir rajono savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“, vykdomo pagal priemonę „Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“
3.4.6	Paplūdimio prie Neveronių tvenkinio įrengimas	Įrengtas paplūdimys	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Nepradėta vykdyti		Bus įrengtas paplūdimys

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Vykdomas procesas saug.ter. apsaugos užtikrinimui: patvirtintas Kauno marių reg.parko, bufer.AZ ribų bei parko tvarkymo planas; rengiami Kamšos valst.bot.-zool.draustinio ribų ir tvarkymo planai. Vykdomi darbai aplinkos apsaugos gerinimui ir esamų rekreac.išteklų tvarkymui: tvarkomos užterštos ter. (įgyvendinamas buvusios karinės teritorijos sutvarkymo proj.); atlikta 50 proc. darbų stacionarių aikštelių atliekų kontein.plėtos procese; tvarkomi ir pritaikomi visuom.poreikiams vandens telkiniai ir pakrantės. Vyksta gamt.karkaso ir kraštov.elementų pritaikymas turizmui (piliakalnių pritaikymas lankymui, kultūros vertybių obj. pritaikymas turizmui). 2018 m. stebimas žymus (+18,8%) turistų sk. augimas, lyginant su 2017 m. Plėtojami dviračių takai (kurort.ter., gyv.vietovių (Akademijos, Karmėlavos, Garliavos mstl.) jungtys su Kauno m.); Turistiniais tikslais įveiklintas vandens transportas (įrengta mobili prieplauka Kulautuvoje, nustatyti keleivių vežimo maršrutai, jungtys su Kauno m.).

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Lėtai vyksta rekreacinių teritorijų ir viešųjų laisvalaikio erdvių plėtra: paplūdimių, parkų ir skverų įrengimas ir rekonstrukcija. Dalies viešųjų erdvių įrengimas sustojęs sprendžiant žemės nuosavybės klausimus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
4	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir naudojimas					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdamos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 10		
4.1	Kultūros paveldo objektų apsauga					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdamos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
4.1.1	Kauno rajono savanorių atminimo įamžinimas	10-yje vietų pastatyti 11 atminimo knygų-suoliukų	Savivaldybės administracija; seniūnijos	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2016	Igyvendinta	2016-10-09	10-yje vietų pastatyti 11 atminimo knygų-suoliukų
4.1.2	Bažnyčių ir jose esančio sakralinio paveldo išsaugojimas	Sutvarkytas sakralinis, architektūrinis paveldas 21-oje bažnyčioje	Savivaldybės administracija, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos kurijos	Kita		2015	2019	Vykdoma		Sutvarkyta Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvora. Tvarkoma Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
4.1.3	Priešgaisrinės apsaugos įrengimas sakralinio paveldo objektuose, prioritetą skiriant mediniams , įtrauktiems į kultūros paveldo registrą objektams ir/ar juose esančioms kilnojamoms kultūros paveldo vertybėms	Priešgaisrinė apsauga įrengta 21-oje bažnyčioje	Savivaldybės administracija; Kauno arkivyskupija, Vilkaviškio vyskupija; Sentikių bendruomenė; Parapijos	Valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Priešgaisrinė ir apsaugos sistemos įrengtos 19 bažnyčių, 5 pakeista elektros instaliacija.
4.1.4	Skulptūrų ir paminklų statymo ir nukeldinimo Kauno rajone tvarkos parengimas	Parengta mažosios architektūros atstatymo ar nuėmimo tvarka.	Savivaldybės administracija	Valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Bus parengta mažosios architektūros atstatymo ir nuėmimo tvarka
4.1.5	Čekiškės mstl. urbanistinių vietovių apskaitos dokumentų parengimas	Parengti kultūros paveldo apsaugos planas	Savivaldybės administracija; Kultūros paveldo departamentas	Valstybės biudžeto lėšos		2015	2016	Įgyvendinta	2016-02-22	Kultūros paveldo departamento vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-SK-290. Parengtas teritorijos ribų planas.
4.1.6	Zapyškio šv. Jono krikštytojo bažnyčios atnaujinimas ir prieigų sutvarkymas	Sutvarkyta šv. Jono krikštytojo bažnyčia ir jos prieigos	Savivaldybės administracija, Vilkaviškio vyskupijos kurija	Kita		2016	2019	Vykdoma		Tvarkoma Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Bažnyčios panauda savivaldybei.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
4.2	Kultūros paveldo objektų pritaikymas visuomenei					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
4.2.1	T. Ivanausko Obelynės sodybos išsaugojimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmui ir visuomenės poreikiams	Įkurtas Kauno r. muziejaus filialas	Savivaldybės administracija; Kauno r. muziejus; savininkė E. Baltuškevičienė	Kita		2015	2015	Igyvendinta	2015-06-18	Įkurtas Kauno r. muziejaus filialas, patvirtinti muziejaus nuostatai
4.2.2	Istorinio memorialinio paveldo išsaugojimas jų įtraukimas į turizmo maršrutus	Sutvarkytos ir paženklintos rajone esančios partizanų, laisvės kovotojų, I ir II pasaulinių karų karių 22 palaidojimo vietos ir 13 žydų kapinių	Seniūnijos; savivaldybės administracija;	Valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Paženklinta apie 40 memorialinio paveldo objektų, nuolat prižiūrimas ir tvarkomas istorinis memorialinis paveldas
4.2.3	Archeologinio paveldo – piliakalnių pritaikymas turizmui (tame tarpe Pyplių, Lantainių, Ringovės, Paštuvos, Jadagonių piliakalniai)	Piliakalnių ir jų prieigų sutvarkymas (pastatyti informaciniai kelio ženklai ir informaciniai stendai, įrengti laiptai, sutvarkyta aplinka)	Savivaldybės administracija; Turizmo ir verslo informacijos centras	Kita		2015	2019	Vykdoma		Tvarkomas archeologinis paveldas - piliakalniai. 10 piliakalnių pritaikyta lankymui, įrengti laiptai, patogesnis privažiavimas, informacinės nuorodos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim- o data	Rezultato aprašymas
4.2.4	Kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui Kauno r.	Parengta nekilnojamojo kultūros paveldo objektų analizė ir pateikti pasiūlymai jo sutvarkymui, pritaikymui visuomenės poreikiams ir turizmo reikmėms.	Savivaldybės administracija; Turizmo ir verslo informacijos centras; Seniūnijos	Kita		2015	2019	Vykdoma		Vykdomas Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos prieigų sutvarkymas, Tado Ivanausko Obelynės sodybos parkas tvarkymo darbai, kuriami maršrutai: Kauno rajono muziejaus projektas „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: paveldo sodų turas“

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Sparčiai vykdomi sakralinio paveldo apsaugos nuo gaisro poveikio darbai (prioritetas teiktas mediniams, įtrauktiems į kultūros paveldo registrą objektams ir/ar juose esančioms kilnojamoms kultūros paveldo vertybėms) – 90 proc. planuotų objektų įrengtos priešgaisrinės ir apsaugos sistemos bei vykdyti elektros instaliacijos sutvarkymo darbai.

Vykdomi tvarkybos darbai sakralinių vertybių viešajam naudojimui (2), tvarkymo ir priežiūros, informacinių ir rinkodaros priemonių diegimas istorinių memorialinių paveldo objektų (40), archeologinio paveldo objektų (10 piliakalnių pritaikyta lankymui) turistiniam potencialui didinti.

Vykdomi apskaitos dokumentus turinčių archeologijos paveldo objektų teritorijų ribų, apsaugos pozonių tikslinimas. Patikslinta 30-iai objektų.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Vykdomų paveldotvarkos darbų apimtis nepakankama tinkamai saugoti Kauno rajono urbanistinio paveldo vertę.

Kulautuvos bei Kačerginės miestelių istorinėms dalims, Kultūros paveldo centrui atlikus reikiamus tyrimus, nenustatytos vertingosios savybės. Dėl lėšų stokos nukelti vertingųjų savybių nustatymo darbai atskiriems išlaikiusiems autentiškumą raiškios architektūros pastatams Kulautuvoje ir Kačerginėje.

Nepradėti vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų parengimo darbai Kauno tvirtovės fortams.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5	Socialinės aplinkos dalies sprendiniai					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 6 Vykdomos priemonės: 11 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 24		
5.1	Urbanizuotų ir urbanizuojamųjų teritorijų aplinkos ir gyvenimo kokybės					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
5.1.1	Projektas "Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" (Ežerėlio miestas)	Parengtas investicinis projektas (bus išnagrinėtos įvairios veiklų vykdymo alternatyvos ir pasirinkta optimali projektų įgyvendinimo alternatyva, pagal kurią bus rengiami techniniai projektai)	Savivaldybės administracija; seniūnija	Kita		2015	2019	Vykdoma		Investiciniu projektu planuojama atnaujinti sporto stadioną; sutvarkyti daugiabučių kiemus; atnaujinti Liepų ir Kauno g. šaligatvius; įrengti vaikų žaidimo aikštes; įrengtos treniruoklių aikštes

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5.1.2	Garliavos m. daugiabučių namų viešųjų erdvių sutvarkymas	Įgyvendinti Liepų, S. Lozoraičio ir Žaliosios gatvėse esančių modernizuotų daugiabučių gyvenamosios aplinkos tvarkymo darbai, įrengtos vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, prekybos erdvės, rekonstruoti ir atnaujinti šaligatviai, gatvių atkarpas, pėsčiųjų takai ir įvažiavimai į kiemus	Savivaldybės administracija	Kita		2015	2019	Nepradėta vykdyti		Bus sutvarkytas daugiabučių namų viešosios erdvės
5.1.3	Pastato Parko g. 6, Bubių k., Batniavos sen. pritaikymas socialiniam būstui	Rekonstruotas ir socialiniam būstui pritaikytas buvęs vaikų darželio pastatas	Savivaldybės administracija	Kita		2015	2018	Įgyvendinta		Rekonstruotas ir socialiniam būstui pritaikytas buvęs vaikų darželio pastatas: siūlomi socialiniai būstai asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būsto nuomai (18 butų)
5.1.4	Stebėjimo kamerų įrengimas viešosiose vietose	Įrengtos stebėjimo kameros: Akademijos sen., Alšėnų sen.; Neveronių sen.;	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Įrengtos stebėjimo kameros Kulautuvos, Vilkijos mstl. viešosiose erdvėse, vykdomi įrengimo darbai Kulautuvos ir Kačerginės mstl.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5.2	Švietimo įstaigų infrastruktūra					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 5 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 17		
5.2.1	Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos atnaujinimas	Parengtas projektas ir gautas statybos leidimas	Savivaldybės administracija;	Kita		2015	2019	Vykdoma		Igyvendinta mokyklos rekonstrukcija, vykdomi katilinės rekonstrukcijos darbai ir naujai statomo laisvalaikio salės priestato statybos darbai.
5.2.2	Akademijos sen. Ugnės Karvelis gimnazijos priestato sporto salei statyba	Techninio projekto parengimas	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Nepradėta vykdyti		Bus parengtas techninis projektas
5.2.3	Kauno r. Piliuonos gimnazijos modernizavimas	Pastatytas priestatas, kuriame įsikurs laisvalaikio užimtumo salė, biblioteka, kultūros darbuotojų kabinetai. Rekonstruota sporto/aktų salė, rekonstruotos pusrūsio patalpos, įrengta valgykla.	Savivaldybės administracija;	Kita		2016	2019	Vykdoma		Atlikta didžioji dalis rangos darbų: Piliuonos gimnazijos pastatas baigtas rekonstruoti, vyksta vidaus įrengimo darbai. 2019 m. I ketv. planuojama baigti įrengti laisvalaikio ir užimtumo salę bei baigti rekonstruoti sporto salę, biblioteką

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5.2.4	Universalaus daugiavfunkcinio centro įkūrimas Mastaičių k., Alšėnų sen.	Pastatytas naujas daugiavfunkcinis centras, kuriame veikia vaikų darželis, pradinė mokykla, kultūros centras, biblioteka, ambulatorija, seniūnija;	Savivaldybės administracija;	Kita		2016	2019	Vykdoma		Parengtas techninis projektas
5.2.5	Universalaus daugiavfunkcinio centro Ledos g. 2, Užliedžių k. rekonstravimas	Rekonstruotas esantis pastatas ir įkurtas daugiavfunkcinis centras, pritaikytas darželio, mokyklos, bibliotekos, laisvalaikio salės, ambulatorijos, seniūnijos poreikiams;	Savivaldybės administracija	Kita		2016	2019	Vykdoma		Koreguojamas parengtas techninis projektas
5.2.6	Vandžiogalos, Garliavos Jonučių ir Raudondvario gimnazijų rekonstrukcija	Rekonstruotos 3 gimnazijos	Savivaldybės administracija	Kita		2016	2019	Nepradėta vykdyti		Bus rekonstruotos 3 gimnazijos
5.2.7	Garliavos m. Liepų g. pastato, priklausiusio policijai, keitimas ir darželio įrengimas	5 ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas	Savivaldybės administracija	Kita		2016	2018	Igyvendinta		Įrengtos 5 ikimokyklinio ugdymo grupės

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5.2.8	Investicinis projektas – Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos modernizavimas	Atnaujintos mokyklos vidaus erdvės renovuojant elektros, šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemas, atlikta lubų, grindų, sienų apdaila, modernizuota ugdymo aplinka naujomis mokymo priemonėmis ir baldais;	Savivaldybės administracija	Valstybės biudžeto lėšos		2014	2018	Igyvendinta		Atlikti mokyklos renovavimo darbai, atnaujinant vidaus ir išorės aplinką, bei modernizuojant ugdymo aplinką
5.2.9	ŠMM projektas – Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) vidaus erdvių modernizavimas - Šlienavos pagrindinės mokyklos vidaus erdvės modernizavimas	Modernizuotos mokyklos vidaus edukacinės erdvės (pastato vidinės sienos, grindys, mokomieji kabinetai, laboratorijos, dirbtuvės, sporto salė, švietimo pagalbos specialistų kabinetai, žaidimų ir poilsio vietos);	LR Švietimo ir mokslo ministerija	Europos Sąjungos paramos lėšos		2015	2019	Vykdoma		Parengtas techninis projektas
5.2.10	Akademijos mstl. vaikų darželio įrengimas	A. Stulginskio universiteto bendrabučio patalpose įrengtas vaikų darželis - įkurtos 4 priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės.	Savivaldybės administracija	Kita		2015	2016	Igyvendinta	2016-09-01	Įrengtas vaikų darželis

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5.2.11	Lapių vaikų lopšelio darželio remontas	Atliktas remontas ir 2 papildomų ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas	Savivaldybės administracija; Lapių seniūnija	Kita		2016	2019	Nepradėta vykdyti		Planuojama suremontuoti vaikų lopšelių-darželių, negautas finansavimas
5.2.12	Neveronių gimnazijos ir Neveronių lopšelio-darželio pastato remontas	Atliktas remontas	Savivaldybės administracija;	Valstybės biudžeto lėšos		2018	2019	Nepradėta vykdyti		Bus atliktas remontas
5.2.13	A. ir A. Kriauzių mokyklos darželio Vyturių g. 2C, Raudondvario k. remontas	Įvykdytas remontas - apšiltinimo darbai, stogo remontas	Savivaldybės administracija; Mokyklos administracija	Valstybės biudžeto lėšos		2018	2019	Vykdoma		Pradėta II korpuso (vieno iš 4 korpusų) rekonstrukcija. Vykdomi vidaus rekonstravimo ir lauko (stogo) remonto darbai.
5.2.14	Zapyškio sen. Zapyškio pagr. m-klos sporto salės įrengimas.	Techninio projekto parengimas	Savivaldybės administracija; Mokyklos administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Rengiamas techninis projektas
5.2.15	Babtų sen. Panevėžiuko pagr. mokyklos sporto salės remontas	Atliktas remontas	Savivaldybės administracija; Mokyklos administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2018	Igyvendinta		Atlikti vidaus šiltinimo darbai, suremontuoti persirengimo kambariai, sanitarinės patalpos (2017 m.). Atliktas sporto salės remontas (apdailos darbai, šildymo, vėdinimo sistemų atnaujinimas, elektros instaliacijos darbai).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5.2.16	Zapyškio sen. mokyklos dienos centro statyba	Pastatytas prie mokyklos priestatas	Savivaldybės administracija; Mokyklos administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2018	2019	Nepradėta vykdyti		Bus pastatytas mokyklos dienos centras
5.2.17	Vilkijos gimnazijos vaikų dienos centro įkūrimas Vilkijos apylinkių sen., Akuotų k., Saulėtekio g. 89	Įkurtas vaikų dienos centras	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2016	Igyvendinta	2016-05-27	Įkurtas vaikų dienos centras, patvirtinti nuostatai
5.3	Kultūros ir sporto infrastruktūros plėtra					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5.3.1	Vaikų žaidimo ir sporto aikštelių įrengimas (Akademijos mstl., Pažerų k., Babtų mstl., Miškalaukio k., Liučiūnų k., Garliavos m., Ilgakiemio k., Teleičių k., Neveronių k., Naugardiškės k., karmėlavos II k., Ramučių k. parke, Piliuonos k., Naujųjų Muniškių k., Užliedžių k., Giraitės k., Vandžiogalos mstl., Vilėnų k., Altoniškių k. ir kt.)	Parengta apie 19 techninių projektų	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Bus įrengtos vaikų žaidimo ir sporto aikštelės
5.3.2	Švietimo įstaigų sporto infrastruktūros atnaujinimas (Raudondvario k., Viršužiglio k., Saulėtekio k., Neveronių k., Daugėliškių k., Purviškių k. ir kt.)	Sutvarkytos ir atnaujintos 6 aikštelės	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Kita		2015	2019	Nepradėta vykdyti		Bus atnaujinta švietimo įstaigų sporto infrastruktūra

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
5.3.3	Babtų kultūros centro remontas	Atliktas remontas	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2018	Vykdoma		Suremontuoti salės stogas, sanitariniai mazgai, sanitarinės patalpos, salė, fojė, nauja elektros skydinė, pradėtas vėdinimo sistemos remontas.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Vykdomi soc.aplinkos sprendiniai nukreipti į mokymosi kokybinę aplinką per esamos infrastrukt.sutvarkymą ir elementariąją „infrastruktūrinę higieną“ (modernizuojamos, renovuojamos mokymosi įstaigos, atnaujinami elektros tinklai, apšiltinami pastatai, stogai, atnaujinamas mokyklų inventorių, vykdoma būtiniosios infrastruktūros plėtra (bibliotekų, sporto salių įrengimo darbai)). Didinamas mokyklų daugiafunkciškumas: aplinka pritaikoma visuom.laisvalaikio ir užimtumo reikmėms.

Švietimo infrastrukt.obj.plėtra įgyvendinama optimizuojant esamus obj. (priklausęs policijai pastatas Garliavos m. pritaikytas ikimokyklinio ugdymo reikmėms; vaikų darželis įrengtas A. Stulginskio univ.bendrabučio patalpose).

Įgyvendinti soc.rūpybos obj.plėtos sprendiniai, optimizuojant esamų objektų panaudojimą asmenims ir šeimoms, turinčioms poreikį soc.būsto nuomai (rekonstruotas ir soc.būstui pritaikytas buvęs vaikų darželio pastatas).

Gerinama gyv.aplinkos kokybė: vykdoma daugiabučių namų, pastatų renovacija.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nepradėti vykdyti viešųjų erdvių daugiabučių gyvenamojoje aplinkoje sutvarkymo darbai.

Lėtai vyksta vaikų laisvalaikio erdvių – žaidimų aikštelių, įrengimo darbai. Ties įgyvendinimo riba tik tos vaikų žaidimo aikštelės, kurios įgyvendinamos investiciniu projektu "Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" (Ežerėlio, Vilkijos gyvenamosiose vietovėse).

Nepradėti vykdyti kai kurių esamų ikimokyklinio ugdymo įstaigų atnaujinimo (remonto) darbai (Lapių, Neveronių sen.), dienos centro statybos darbai (Zapyškio sen.).

Lėtas saugumo priemonių (viešosiose erdvėse įrengiant stebėjimo kameras) diegimo tempas (įrengtos Kulautuvos, Vilkijos mstl.).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6	Susisiekimo dalies sprendiniai					2014	2024	Igyvendintos priemonės: 10 Vykdomos priemonės: 15 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 26		
6.1	Valstybinės reikšmės kelių rekonstravimas					2015	2024	Igyvendintos priemonės: 6 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
6.1.1	Kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai dešinės pusės rekonstravimas	Kelio ruožo nuo 17,34 km iki 21,85 km (4.51 km) rekonstrukcija. Parengtas specialusis planas, techninis projektas, paskelbtas darbų atlikimo konkursas	Lietuvos automobilių kelių direkcija	Europos Sąjungos paramos lėšos		2015	2016	Igyvendinta	2016-09-12	Atliktas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 17,34 iki 22,03 km (dešinės kelio pusės) rekonstravimas (statybos darbų perdavimo aktas 2016-09-12 Nr. KTA-133).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.1.2	Kelio Kaunas-Zapyškis-Šakiai rekonstravimas	Kelio ruožo nuo 10,2 km iki 16.7 km (6.5 km) rekonstrukcija. Parengtas techninis projektas, paskelbtas darbų atlikimo konkursas	Lietuvos automobilių kelių direkcija	Europos Sąjungos paramos lėšos		2015	2016	Igyvendinta	2016-07-01	Atliktas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 10,20 iki 16,70 km rekonstravimas (statybos darbų perdavimo aktas 2016-07-01 Nr. KTA-63).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.1.3	Kelio Kaunas-Prienai-Alytus rekonstravimas	Kelio ruožo nuo 13,1 km iki 19,1 km (6.0 km) rekonstrukcija. Parengtas specialusis planas, projektas derinamas su visuomene	Lietuvos automobilių kelių direkcija	Europos Sąjungos paramos lėšos		2015	2024	Vykdoma		Parengtas ir patvirtintas specialusis planas (Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialusis planas patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-209 (TPD registro kodas T00082190) ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T3-131 (TPD registro kodas T00082209). Rengiami dokumentai pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams pirkimą (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožas nuo 11,60 iki 31,10 km)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.1.4	Kelio Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda rekonstravimas	Kelio ruožo nuo 18,00 km. iki 22,70 km (4,7 km) rekonstrukcija. Numatoma parengti techninį projektą	Lietuvos automobilių kelių direkcija	Europos Sąjungos paramos lėšos		2015	2016	Igyvendinta	2016-10-12	Atliktas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 18,00-22,70 km rekonstravimas (statybos darbų perdavimo aktai 2016-10-12 Nr. KTA-243 ir 244).
6.1.5	Privažiuojamojo kelio prie Kulautuvos nuo kelio Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda rekonstravimas	Kelio ruožo nuo 0,0 km iki 2,1 km (2,1 km) rekonstrukcija. Parengtas techninis projektas, paskelbtas darbų atlikimo konkursas	VĮ „Kauno regiono keliai“	Kita		2015	2017	Igyvendinta	2017-01-05	Atliktas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1909 Privažiuojamojo kelio prie Kulautuvos nuo kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 0,0 iki 2,1 km rekonstravimas (statybos darbų perdavimo aktas 2017-01-05 Nr. KTA-23)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim- o data	Rezultato aprašymas
6.1.6	Kelio Kaunas-Zarasai-Daugpilis rekonstravimas	Kelio ruožo nuo 5,95 km iki 12,26 km (6,31 km) rekonstrukcija. Parengtas techninis projektas	VI „Kauno regiono keliai“	Kita		2016	2017	Įgyvendinta	2017-10-12	Parengtas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožo nuo 5,95 iki 12,122 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas ir atlikti darbai (atliktų statybos darbų perdavimo aktas 2017-10-12 Nr. KTA-256)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.1.7	Kelio Vainatrakis - Pakuonis remontavimas	Kelio ruožo nuo 1,98 km iki 8,67 km (6,69 km) rekonstrukcija. Parengtas techninis projektas, paskelbtas darbų konkursas	VI „Kauno regiono keliai“	Kita		2017	2019	Vykdoma		2018 m. III ketv. viduryje paskelbtas viešasis darbų pirkimas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1913 Rokeliai–Vainatrakis–Pakuonis ruožo nuo 1,98 iki 5,48 km rekonstravimas“. Darbus (asfaltavimą) minėtame ruože numatoma atlikti 2019 m. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1913 Rokeliai–Vainatrakis–Pakuonis ruožas nuo 5,48 iki 8,67 km nepateko į asfaltuojamų žvyrkelių 2018-2020 m. programą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.1.8	Kelio Margininkai - Piliuona remontavimas	Kelio ruožo nuo 2,77 km iki 6,94 km (4,17 km) rekonstrukcija. Numatoma parengti techninį projektą.	VI „Kauno regiono keliai“	Kita		2016	2018	Įgyvendinta	2018-05-11	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1936 Margininkai–Piliuona ruožas nuo 2,665 iki 3,7 km ir nuo 5,2 iki 6,902 km baigtas asfaltuoti (objektas priduetas Kelių direkcijai 2018 m. gegužės 11 d. pasirašant atliktų statybos darbų perdavimo aktus Nr. KTA-183 ir 184)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.1.9	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo nuo 11,20 iki 15,90 km rekonstravimas (aplinkkelio įrengimas)	Bus rekonstruotas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožas nuo 11,20 iki 15,90 km.	Lietuvos automobilių kelių direkcija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Kelių direkcija, atsižvelgdama į kelių dangos būklę, kelių statinių būklę, aplinkosauginių priemonių ir saugaus eismo priemonių poreikį (dviračių takai, sankryžos, atitvarai ir kita), rengia valstybinės reikšmės magistralinių kelių, kuriuos būtina rekonstruoti, reitingavimo metodiką. Parengus metodiką, bus sudaryta bendra minėtų kelių ruožų rekonstravimo eilė, pagal kurią Kelių direkcija, atsižvelgdama į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo galimybes, planuos darbus ir spręs, kada galima pradėti Karmėlavos aplinkkelio įgyvendinimą

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.2	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos darbai					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdamos priemonės: 12 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 17		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.2.1	Gatvių rekonstrukcija: Akademijos sen., Alšėnų sen., Babtų sen., Batniavos sen., Ežerėlio sen., Garliavos sen., Garliavos apyl. sen., Karmėlavos sen., Linksmakalnio sen., Neveronių sen., Raudondvario sen., Užliedžių sen., Zapyškio sen.	Numatoma rekonstruoti ar remontuoti 23 gatves: Obelynės g. - 1,8 km, Sodų g. - 0,25 km, Garliavos g. - 0,45 km, Prieklauskos g. - 0,20 km, Karklės g. - apie 1,00 km, Kauno g. - 2,00 km, K. Aglinskio g. 0,70 km, Vasario 16-osios g. - 1,00 km, Mokyklos g. - 0,40 km, Kauno g., Gėlių g. - 1,65 km, K. Bielinio g. - 1,30 km, Žirgyno g. - 0,36 km, Kęstučio g., Piliakalnio g. - 1,00 km, Liepų g. - 1,00 km, Krašto g. - 1,70 km, Keramikų g. - 1,30 km, Instituto g. - 0,60 km, Vyturių g. - 0,60 km, Nevėžio g. - 0,35 km, Ledos g. - 1,60 km, Liepų g. - 0,80 km.	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Įgyvendinti 19 gatvių remonto, rekonstravimo ar rekonstravimo projektų parengimo darbai (Akademijos sen., Alšėnų sen., Batniavos sen., Ežerėlio sen., Garliavos sen., Garliavos apyl. sen. (Vasario 16 g. remontas, rekonstravimo projektas Mokyklos g.), Karmėlavos sen. (Žirgyno g. remontas, Kauno ir Gėlių g., K.Bielinio g. rekonstravimo projektai), Linksmakalnio sen., Neveronių sen., Raudondvario sen. Užliedžių sen. Zapyškio sen.). Vykdomi Karmėlavos sen. Kęstučio ir Piliakalnio g., Neveronių sen. Krašto g. rekonstravimo darbai Raudondvario sen. Nevėžio g. rekonstravimas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.2.2	Gatvių asfaltavimas: Čekiškės sen., Čekiškės mstl., Klumpės g.; Garliavos sen., Garliavos m., V. Kudirkos g., Beržų g.; Lapių sen., Šatijų k., Dvaro g.; Vilkijos apyl. sen., Jaučakių k., Plento g.	Išasfaltuotos 5 gatvės: Čekiškės mstl. Klumpės g. - 0,80 km, Garliavos sen. V. Kudirkos g. - 0,60 km, Garliavos sen. Beržų g. - 0,5 km, Lapių sen. Dvaro g. - 1,30 km, Vilkijos sen. Plento g. - 0,50 km.	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Igyvendinti darbai: Čekiškės mstl. Klumpės g. asfaltavimas, Garliavos sen. V.Kudirkos g. ir Beržų g. asfaltavimas, Vilkijos sen. Plento g. asfaltavimas Vykdomi darbai: Lapių sen. Dvaro g. asfaltavimas
6.2.3	Keleivių laukimo paviljonų įrengimas	Įrengti apie 16 keleivių laukimo paviljonų	Savivaldybės administracija	Kita		2015	2018	Igyvendinta		Keleivių laukimo paviljonai įrengti (Taurakiemio, Vandžiogalos, Babtų, Čekiškės, Lapių, Karmėlavos ir Zapyškio seniūnijose)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.2.4	Saugaus eismo priemonių įrengimas: šaligatvių įrengimas; apšvietimo įrengimas; šviesoforų įrengimas ir kt.	Gerinamos pėsčiųjų eismo sąlygos ir eismo sauga: Įrengtas Durpyno g. Ežerėlio m. apšvietimas; Garliavos apyl. sen. Ilgakiemio k. nuo autobusų stotelės iki Sūduvos g. prie pėsčiųjų tako apšvietimo įrengimas; Išplėsti gatvių apšvietimo tinklai Rokų sen. teritorijoje Šaligatvio ir apšvietimo įrengimas Sausio g. 13-osios g. Sitkūnų k., Babtų sen.; Parko ir Darbininkų g. šaligatvių atnaujinimas Batniavos sen. ir kt.	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Įgyvendinti darbai: Ežerėlio sen. Durpyno g. apšvietimas; Babtų sen. Sitkūnų g. Sausio 13-osios g. šaligatvio įrengimas; Batniavos sen. Parko ir Darbininkų g. šaligatvių remontas
6.2.5	Pėsčiųjų tako įrengimas Babtų mstl., šalia Kauno g.	Techninio projekto parengimas, įrengta pėsčiųjų eismo infrastruktūra	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Vykdomi Babtų sen. Kauno g. pėsčiųjų tako remonto darbai
6.2.6	Zapyškio sen. Liepų gatvėje prie senųjų kapinių įrengti mašinų stovėjimo aikštelę	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas	Savivaldybės administracija; Zapyškio seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2016	Igyvendinta	2016-07-29	Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.2.7	Garliavos sen. Vytauto g. sutvarkymas	Aikštės, gatvės apšvietimo sutvarkymas. kamerų ir ekranų įrengimas, apželdinimas. Apželdinimo projektas parengtas, darbai vykdomi nuo 2012 m.	Savivaldybės administracija; Garliavos seniūnija.	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Atliekami šaligatvio remonto ir apšvietimo įrengimo darbai
6.2.8	Garliavos sen. šviesoforų įrengimai ir rekonstrukcija	Prie Garliavos meno mokyklos ir prie Garliavos A. Mitkaus pagrindinės mokyklos	Savivaldybės administracija; Raudondvario seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2018	Igyvendinta		Įrengtas naujas šviesoforas prie meno mokyklos ir atnaujintas šviesoforas prie A.Mitkaus mokyklos
6.2.9	Garliavos sen. įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę aikštėje, esančioje prie Garliavos seniūnijos ir Lietuvos pašto	Atsiras galimybės įkrauti elektromobilius ir jiems populiarėti	Savivaldybės administracija; Garliavos seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2014	2019	Nepradėta vykdyti		Planuojama įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas, ekologiško transporto naudojimo skatinimui
6.2.10	Garliavos sen. dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas sukanalizuojant griovį	Bus įrengtas dviračių takas nuo Ramybės g. iki Sodų g. (apie 200 m)	Savivaldybės administracija; Garliavos seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Pėsčiųjų-dviračių takas įrengtas, liko įgyvendinti sprendimus lietaus surinkimo užtikrinimui
6.2.11	Garliavos sen. dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas	Bus įrengtas dviračių takas nuo Žaliosios g. iki pard. "Maxima" (apie 641 m)	Savivaldybės administracija; Garliavos seniūnija	Kita		2014	2018	Igyvendinta		Įrengta dviračių tinklo infrastruktūra susisiekimo dviračiais užtikrinimui

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
6.2.12	Garliavos sen. Šaligatvio įrengimas	Bus įrengtas šaligatvis S. Lozoraičio g. nuo parduotuvės "Iki" iki UAB "Gamega" (500 m); Vytauto g. nuo Gėlių iki Marijampolės plento abiejuose gatvės pusėse	Savivaldybės administracija; Garliavos seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Įvykdytas viešasis pirkimas rangos darbams, darbų pradžia numatoma 2019 m.
6.2.13	Garliavos sen. S. Lozoraičio g. dalies asfaltavimas	S. Lozoraičio gatvės dalies asfaltavimas nuo UAB "Gamega" iki parko (apie 187 m)	Savivaldybės administracija; Garliavos seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Įvykdytas viešasis pirkimas rangos darbams, darbų pradžia numatoma 2019 m.
6.2.14	Garliavos sen. parkavimo aikštelės įrengimas šalia parko 0,1580 ha	Aikštelė bus įrengta S. Lozoraičio g. Nr. 14A, 16, 16A	Savivaldybės administracija; Garliavos seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Įvykdytas viešasis pirkimas rangos darbams, darbų pradžia numatoma 2019 m.
6.2.15	Garliavos sen. parkavimo aikštelės įrengimas Sodų g. prie kapinių 0,95 ha	Bus įrengta parkavimo aikštelė	Savivaldybės administracija; Garliavos seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Įrengiama parkavimo aikštelė
6.2.16	Garliavos sen. automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas Ramybės g. žemės sklype prie kapinių	techninio projekto parengimas	Savivaldybės administracija Garliavos seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Rengiamas techninis projektas
6.2.17	Rytinio apvažiavimo Ežerėlis-Vilemų kelias įrengimas	Įrengtas rytinis apvažiavimas	UAB "Klasmann-Deilmann-Ežerėlis"	Kita		2015	2019	Vykdoma		Baigiamas rengti techninis projektas ir laukiama ekspertizės išvadų

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo, remonto darbų įgyvendinta apie 67 proc. Likusi dalis valstybinės reikšmės kelių yra įgyvendinimo procese dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, viešųjų pirkimų procedūrų arba Lietuvos automobilių kelių direkcijoje taikomos atrankos kelių rekonstravimo reitingavimo vykdomo proceso.

Vietinės reikšmės kelių/gatvių rekonstrukcijos darbai seniūnijose įgyvendinti 82 proc.

Įgyvendintos gerinimo sąlygos viešojo transporto naudotojams įrengus keleivių laukimo paviljonus.

Įvykdyti bei vykdomi teritorijų išplanavimo projektų parengimo darbai, užtikrinant tvarkingą struktūrinių gatvių plėtrą naujai formuojamose gyvenamosiose teritorijose.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Lėtai vyksta pėsčiųjų infrastruktūros plėtos (įrengimo/atnaujinimo) darbai: šaligatvių, pėsčiųjų takų įrengimo, apšvietimo darbai.

Nepradėti darbai gyvenamųjų teritorijų aplinkkelių pagrindimui bei statybai.

Susisiekimo dviračiais tinklas fragmentiškas, trūksta jungčių.

Nepradėtos įgyvendinti priemonės ekologiško motorinio transporto naudojimo skatinimui (nevykdoma elektromobilių įkrovimo punktų plėtra).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7	Techninės infrastruktūros dalies sprendiniai					2014	2023	Igyvendintos priemonės: 25 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 33		
7.1	Nuotekų ir vandens infrastruktūros tinklų statyba ir plėtra					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 8 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 13		
7.1.1	Zapyškio miestelio vandens kokybės gerinimo įrenginių statyba: Zapyškių k., Girionių k, Juragių k., Padauguvos k., Netonių k., Pažerų k., Piepalių k., Margininkų k., Stanaičių k., Saulėtekio k., Purviškių k., Kaniūkų k.	Pastatyti 12 kaimų įrenginiai	UAB „Giraitės vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Vandens gerinimo įrenginiai įrengti 11 gyvenamųjų vietovių, išskyrus Girionių k.
7.1.2	Zapyškių miestelio artezinio gręžinio įrengimas	Įrengtas gręžinys	UAB „Giraitės vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2015	Igyvendinta	2015-07-31	Įrengtas artezinis gręžinys

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.1.3	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra: Ramučių k., Voškonių k., Piliuonos k.	Įrengti papildomi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai	UAB „Giraitės vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros darbai vykdomi Ramučių, Voškonių ir Piliuonos gyvenamosiose vietovėse.
7.1.4	Piliuonos k. nuotekų valymo įrenginių statyba	Pastatyti įrenginiai	UAB „Giraitės vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Vykdomi projektavimo darbai.
7.1.5	Bubių k. nuotekų tvarkymo tinklų plėtra	Įrengti papildomi nuotekų tvarkymo tinklai	UAB „Giraitės vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Atlikta nuotekų tvarkymo tinklų renovacija
7.1.6	Vandentiekio įrengimas naujose Šlienavos kapinėse	Įrengtas vandentiekis	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2018	Igyvendinta		Atlikti vandentiekio prijungimo darbai į naująsias Šlienavos kapines (370 m.)
7.1.7	Ramučių k., Karmėlavos sen. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra	Renovuoti tinklai	UAB „Giraitės vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Atlikti vandens tiekimo tinklų renovacijos darbai: renovuota 230,65 m tinklų. Vykdomi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros darbai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.1.8	Babčių sen. Piepalių ir Kaniūkų k. vandens gerinimo įrenginių statyba	Pastatyti įrenginiai	UAB „Giraitės vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2017	Igyvendinta		Įrengti vandens gerinimo įrenginiai
7.1.9	Garliavos apyl. sen. Juragių ir Stanaičių k. vandens gerinimo įrenginių statyba	Pastatyti įrenginiai	UAB „Giraitės vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2017	Igyvendinta		Įrengti vandens gerinimo įrenginiai
7.1.10	Domeikavos sen. Voškonių k. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (išplėtimas) ir vandenvietės įrengimas	Rekonstruoti įrenginiai, įrengta vandenvietė	UAB „Giraitės vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2017	Igyvendinta		Įrengta vandenvietė. Voškonių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija atlikta 2013 metais.
7.1.11	Alšėnų sen. Pažerų k. vandens gerinimo įrenginių statyba	Pastatyti įrenginiai	UAB „Giraitės vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2017	Igyvendinta		Įrengti vandens gerinimo įrenginiai
7.1.12	Zapyškio sen. Zapyškio mstl. vandens gerinimo įrenginių statyba	Pastatyti įrenginiai	UAB „Giraitės vandenys“; Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2017	2017	Igyvendinta		Įrengti vandens gerinimo įrenginiai (Kluoniškių k.)
7.1.13	Zapyškio sen. Zapyškio mstl. artezinio gręžinio įrengimas	Įrengtas gręžinys	UAB „Giraitės vandenys“; Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2015	Igyvendinta	2015-07-31	Įrengtas artezinis gręžinys

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.2	Biokatilinių įrengimas mokyklose ir kituose objektuose					2014	2019	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
7.2.1	Biokatilinių įrengimas: Pagynės vaikų globos namuose; Garliavos A. Mitkaus vid. mokykloje; Girininkų pagr. mokykloje; Girininkų pagr. mokyklos Rokų skyriuje; Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje; Panevėžiuko pagr. mokykloje; Batniavos pagr. mokykloje; Neveronių vid. mokykloje; Ilgakiemio mokykloje-darželyje; Čekiškės darželyje; Piliuonos vid. mokykloje; Šlienavos pagr. mokykloje; Kulautuvos pagr. mokykloje; Babtų gimnazijoje.	Įvykdyta šilumos gamybos šaltinių renovacija 15 objektų	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Projektai parengti, finansavimas gautas. Atnaujintos: Garliavos A.Mitkaus, Neveronių vidurinių mokyklų, Karmėlavos B.Buračo gimnazijos, Batniavos, Panevėžiuko, Girininkų pagrindinių mokyklų, Pagynės vaikų globos namų, Vandžiogalos miestelio katilinės. Vykdoma: Čekiškės darželyje, Piliuonos vid. ir Šlienavos pagr. mokyklose.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.2.2	Centralizuotų katilinių biokatilinių įrengimas: Karmėlavos mstl. Babtų mstl. ir Vandžiogalos mstl., Sitkūnų k.	Renovuotos 4 katilinės	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2015	Igyvendinta	2015-07-07	Vandžiogalos katilinėje pastatytas 500 kW biokuro katilas
7.3	Elektros oro linijų keitimas į kabelių liniją ir transformatorinių statyba					2015	2016	Igyvendintos priemonės: 6 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
7.3.1	Domeikavos k. 0,4 kV oro linijos keitimas į kabelių liniją	Pakeistos 1,2 km ir 5,8 km linijos	AB "Lesto"	Kita		2015	2015	Igyvendinta	2015-07-07	Pakeistos numatytos linijos
7.3.2	Ežerėlio mstl. 0,4 kV oro linijos keitimas į 10 kV oro liniją izoliuotais laidais, 2,3 km.	Pakeista 2,3 km linija	AB "Lesto"	Kita		2016	2016	Igyvendinta	2016-09-06	Pakeista 2,3 km. linija
7.3.3	Akademijos 0,4 kV oro linijos keitimas į kabelių liniją 0,03 km.	Pakeista 0,03 km kabelių linija	AB "Lesto"	Kita		2016	2016	Igyvendinta		Pakeista 0,03 km. kabelių linija
7.3.4	Kačerginės mstl. modulinės transformatorinės statyba, 10kV kabelių linijos, 0,05 km, 0,4 kV kabelių linijos 0,23 km tiesimas	Pastatyta transformatorinė; Nutiestos 0,05 km ir 0,23 km kabelių linijos	AB "Lesto"	Kita		2015	2015	Igyvendinta	2015-07-07	Pastatyta transformatorinė; Nutiestos 0,05 km ir 0,23 km kabelių linijos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.3.5	Kačerginės mstl. stulpinės transformatorinės statyba, 0,4 kV kabelių linijos keitimas nauja 0,03 km	Pastatyta transformatorinė; pakeista 0,03 km kabelių linija	AB "Lesto"	Kita		2016	2016	Igyvendinta	2016-02-11	Pastatyta transformatorinė; pakeista 0,03 km. kabelių linija
7.3.6	Kulautuvos mstl. modulinės transformatorinės statyba: (K-152); (K-451); (K-356)	Pastatyta transformatorinė	AB "Lesto"	Kita		2015	2015	Igyvendinta	2015-11-27	Pastatyta transformatorinė
7.4	Dujotiekio infrastruktūros statyba ir plėtra					2015	2023	Igyvendintos priemonės: 10 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 12		
7.4.1	Dujotiekis į gyvenamus namus tarp Pavasario ir Šaltinėlio gatvių, Domeikavos sen., Kauno r., 0,696 km.	Prijungtas 21 vartotojas	AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas	Kita		2015	2016	Igyvendinta	2016-09-30	Prijungti nauji vartotojai
7.4.2	Dujotiekis infrastruktūrai į VĮ Lietuvos oro uostai žemės sklypą Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r., 4,130 km.	4,130 km dujotiekio nutiesimas	AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas	Kita		2015	2015	Igyvendinta	2015-12-30	Nutiestas dujotiekis

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
7.4.3	Dujotiekis infrastruktūrai iki sklypo ribos Industrijos g. 5A, Biruliškių k., Kauno r., 0,238 km.	0,238 km dujotiekio nutiesimas	AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas	Kita		2015	2018	Igyvendinta		Nutiesta 232 m dujotiekio tinklą
7.4.4	Dujotiekis infrastruktūrai Forto gatvėje, Akademijos mstl., Kauno r. sav., 0,683 km.	0,683 km dujotiekio nutiesimas	AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas	Kita		2015	2017	Igyvendinta		Nutiesta 324 m dujotiekio tinklą
7.4.5	Dujotiekis iki AB „Fortum heat Lietuva“ elektrinės Biruliškių k., Kauno r., 1,590 km.	0,159 km dujotiekio nutiesimas	AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas	Kita		2015	2017	Igyvendinta		Nutiesta 15 m dujotiekio tinklą
7.4.6	Dujotiekio tiesimas Vaišvydavoje 15 km.	15 km dujotiekio nutiesimas ir 500 naujų vartotojų prijungimas	AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas	Kita		2016	2018	Igyvendinta		Nutiesta 24 m dujotiekio tinklą, prijungti 149 vartotojai
7.4.7	Dujotiekio tiesimas Neveronyse 4,2 km	4,2 km dujotiekio nutiesimas ir 130 naujų vartotojų prijungimas	AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas	Kita		2016	2018	Igyvendinta		Nutiesta 4,9 km dujotiekio tinklą (2018 m.), prijungti 25 vartotojai
7.4.8	Dujotiekio tiesimas į Kačerginę 9,2 km	9,2 km dujotiekio nutiesimas ir 146 naujų vartotojų prijungimas	AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas	Kita		2018	2019	Vykdoma		Pasirašyta rangos sutartis, darbų įgyvendinimo terminas 2019.05
7.4.9	Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis nuo Kauno m. vakarinio aplinkkelio iki Ringaudų k. ir Noreikiškių gyv. Kauno r. 2.9 km	2,9 km dujotiekio nutiesimas	AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas	Kita		2015	2016	Igyvendinta	2016-11-30	Nutiestas 2,9 km dujotiekis dujotiekis

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim- o data	Rezultato aprašymas
7.4.10	Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungtis Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų teritorijose	Atliktas magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas – Šakiai jungties poveikio aplinkai vertinimas, parengtas specialusis planas, techninis projektas, gauti statybos leidimai	AB „Amber Grid“	Kita		2015	2016	Igyvendinta	2016-04-15	Gautas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-24-160415-00083, Versijos Nr. 1.
7.4.11	Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų teritorijose	Pastatytas magistralinis dujotiekis su linijiniais čiaupų mazgais bei įrengta kontrolinio įtaiso paleidimo kamera	AB „Amber Grid“	Kita		2021	2023	Nepradėta vykdyti		Su trečiosiomis šalimis nesuderintos projekto įgyvendinimo (statybos darbų) finansavimo sąlygos. Preliminarūs projekto (statybos etapo) įgyvendinimo terminai numatomi 2021-2023 m.)
7.4.12	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Girininkų DSS DN300 kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas	Įrengtos kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kameros, pakeistos netinkamos dujotiekio atkarpos, dujotiekis pritaikytas vidinei diagnostikai	AB „Amber Grid“	Europos Sąjungos paramos lėšos		2016	2018	Igyvendinta		Įrengtos kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kameros, pakeitus magistralinio dujotiekio netinkamas atkarpas, dujotiekis pritaikytas vidinei diagnostikai

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Igyvendinta 92 proc. planuotų vandens kokybės gerinimo darbų : iš planuotų 12 gyvenamųjų vietovių, gerinimo įrenginių statyba atlikta 11 (išskyrus Girionių k.) Sparčiai vykdomi darbai gyventojų gyvenamosios kokybės kėlimui, aprūpinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, atliekant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų renovacijos darbus, įrengiant vandens gerinimo įrenginius.

Igyvendinta nemažai dujotiekio infrastruktūros plėtros darbų gyvenamosiose vietovėse:

Įrengti skirstomojo dujotiekio tinklai Biruliškių k., Akademijos mstl., Vaišvydavos k., Neveronių k.: nutiesta 8,4 km skirstomojo dujotiekio tinklų, prijungta virš 170 naujų vartotojų;

Pradėti dujotiekio tinklų įrengimo į Kačerginės mstl. darbai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Gautas finansavimas ir įgyvendinti planuoti biokatilinių įrengimo darbai daugiau nei 50 proc. planuotų objektų 2015 m., šiuo metu vykdomi atnaujinimo darbai: Čekiškės darželyje, Piliuonos vidurinėje mokykloje, Šlienavos pagrindinėje mokykloje. Tačiau dar likę objektai, kuriuose biokatilinių įrengimas neatliktas: Ilgakiemio mokykloje-darželyje, Kulautuvos pagrindinėje mokykloje; Babtų gimnazijoje.

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statyba, nesuderinus finansavimo sąlygų, atidėta vėlesniam laikotarpiui (preliminariai 2021-2023 m. laikotarpiui).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
8	Vilkija					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 5 Vykdamos priemonės: 6 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 11		
8.1	Susisiekimo infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
8.1.1	Vilkijos seniūnijos privažiavimo į prieplauką rekonstrukcija	Planuojama rekonstruoti apie 0,1 km ilgio privažiavimą	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Igyvendinta		Rekonstravimo procesas atliktas
8.1.2	Baigti asfaltuoti Vytauto gatvę Vilkijos m.	Išasfaltuota Vytauto g.	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2015	Igyvendinta	2015-12-30	Seniūnijos duomenimis darbai Vytauto gatvėje baigti
8.1.3	Čekiškės g. Vilkijos m. šaligatvio pėsčiųjų tako atnaujinimas	Atnaujintas pėsčiųjų takas	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2015	Igyvendinta	2015-12-30	Nutiesta apie 300 metrų šaligatvio nuo Čekiškės g. 73 iki Čekiškės g. 63
8.1.4	Valstybės saugomojoje Vilkijos m. teritorijoje Kauno ir Bažnyčios gatvių rekonstrukcija	Rekonstruota apie 1,00 km gatvių	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Igyvendinta: Bažnyčios g. paklota nauja asfalto danga Nepradėta vykdyti: Kauno g. Planuojamas techninio projekto rengimas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
8.2	Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
8.2.1	Likusios miesto dalies nuotekų kanalizacijos linijų įrengimas	Įrengtos linijos	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Numatyta pakloti dalį kanalizacijos ir vandentiekio tinklų
8.2.2	Vydūno alėjos apšvietimo modernizavimas	Modernizuotas alėjos apšvietimas	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Parengtas techninis projektas. Dėl lėšų stokos priemonė neįgyvendinta.
8.3	Socialinė infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
8.3.1	Projektas "Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" (Vilkijos miestas)	Parengtas investicinis projektas (bus išnagrinėtos įvairios veiklų vykdymo alternatyvos ir pasirinkta optimali projektų įgyvendinimo alternatyva, pagal kurią bus rengiami techniniai projektai)	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Kita		2015	2019	Vykdoma		Baigiamas sutvarkyti Čekiškės g. šaligatvis su apšvietimu; Luko skv. sutvarkytas; parengti projektai ir vykdomi viešieji pirkimai vaikų žaidimo aikštelei ir masinių renginių scenai
8.3.2	Tolimesnis naujųjų kapinių įrengimas	Įrengtos kapinės	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Vyksta derinimas dėl kolumbariumo projekto rengimo, dalyje suplanuotų takų zonų vykdomi apželdinimo darbai
8.3.3	Vilkijos gimnazijos stadiono renovacija	Renovuotas stadionas	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Igyvendinta		Atlikta stadiono renovacija
8.3.4	Stebėjimo kamerų įrengimas viešosiose vietose	Įrengtos stebėjimo kameros	Savivaldybės administracija;	Valstybės biudžeto lėšos		2015	2018	Igyvendinta		Realizuojant gyventojų saugumo priemonių įgyvendinimą, viešosiose erdvėse įrengtos 2 stebėjimo kameros
8.4	Kultūros paveldo objektų apsauga					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
8.4.1	Vilkijos m. urbanistinių vietovių apskaitos dokumentų parengimas	Parengtas kultūros paveldo apsaugos planas	Savivaldybės administracija; Kultūros paveldo departamentas	Valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Yra rengiamas kultūros paveldo apsaugos planas. Kultūros paveldo departamentas identifikuoja ir inventorizuoja išliekamąją vertę turinčius pastatus ir kt., ruošia planą

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Vykdomi gyvenimo ir susisiekimo kokybės gyvenamojoje aplinkoje gerinimo darbai:

1. Atnaujinama infrastruktūra susisiekimui pėsčiomis (įgyvendinant projektą "Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" Vilkijos mieste, baigiamas tvarkyti Čekiškės g. šaligatvis su apšvietimu, sutvarkytas Luko skveras, parengti projektai ir vykdomi viešieji pirkimai vaikų žaidimo aikštei ir masinių renginių scenai);
2. Atnaujinama gatvių danga (Vytauto, Bažnyčios g.), įrengiamas privažiavimas į prieplauką, vystomos viešosios erdvės prieplaukos teritorijoje;
3. Renovuojami ir modernizuojami visuomeniniai (atlikta Vilkijos gimnazijos stadiono renovacija) ir gyvenamieji pastatai;
4. Įgyvendinamos priemonės gyventojų saugai viešosiose erdvėse įrengiant vaizdo stebėjimo kameras.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Lėtai vyksta viešųjų erdvių apšvietimo modernizavimo darbų įgyvendinimas Vydūno alėjoje, kuris nukeltas vėlesniam laikotarpiui.
Dėl besitęsiančių inžinerinės infrastruktūros plėtros darbų, nebaigti įgyvendinti susisiekimo infrastruktūros kokybės gerinimo darbai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
9	Kulautuva					2014	2019	Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
9.1	Susisiekimo infrastruktūra					2015	2019	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
9.1.1	Dviračių tako Šilelio k. – Kulautuvos mstl. įrengimas	Planuojama įrengti apie 6 km. ilgio taką	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Baigta asfaltuoti 6 km atkarpa. Planuojama įrengti 1 km atkarpa iki sodų bendrijos „Kernavė“. Darbų įgyvendinimo procesą stabdo žemės nuosavybės klausimai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
9.1.2	Akacijų alėjos atnaujinimas ir Miško g. asfaltavimas	Atnaujinta Akacijų alėja ir išasfaltuota Miško gatvė	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2018	2019	Vykdoma		Miško gatvės asfaltavimo darbai įgyvendinti. Akacijų al. atnaujinimo darbai nukelti dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros (9.3.1 punktas) numatomų ir pradėtų vykdyti darbų
9.1.3	Pėsčiųjų tako atnaujinimas	Atnaujinti pėsčiųjų takai Kulautuvos mstl.	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Pėsčiųjų takų atnaujinimas bus atliekamas atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros (9.3.1 punktas) numatomus ir pradėtus vykdyti darbus.
9.2	Socialinė infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
9.2.1	Projekto "Kulautuvos jaunimo centro paslaugų plėtra" Kulautuvos pagrindinėje mokykloje įgyvendinimas	Kulautuvos pagrindinėje mokykloje bus renovuota sporto salė, 4 patalpos, kuriose įsikurs vaikų dienos centras su atvira jaunimo erdve	Savivaldybės administracija; Kulautuvos pagrindinė mokykla	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2017	Igyvendinta		Atlikta sporto salės renovacija. Įkurtas vaikų dienos centras

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
9.2.2	Kauno rajono Pakaunės PSPC ambulatorinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra bei optimizavimas	Renovuotas Kulautuvos šeimos gydytojo kabinetas	VŠĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras	Valstybės biudžeto lėšos		2016	2019	Nepradėta vykdyti		Negautas finansavimas. Siekiant pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, sveikatos priežiūros centro įrengimas numatomas kitose patalpose. Šiuo metu svarstomi galimi variantai sveikatos priežiūros centro įrengimui.
9.2.3	Stebėjimo kamerų viešose vietose įrengimas	Įrengtos stebėjimo kameros	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Baigti viešieji pirkimai vaizdo kamerų įsigijimui ir įrengimui, derinamas darbų įgyvendinimo grafikas. Numatoma įrengti 2 kameras viešosiose erdvėse
9.3	Inžinerinė infrastruktūra					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
9.3.1	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kulautuvos mstl.	Prijungti nauji vartotojai	UAB "Giraitės vandenys"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Pradėti kloti magistraliniai vandens ir nuotekų tinklai. Darbų pabaiga numatoma 2019 m. III ketv. pabaigoje. Numatomas stebėsenos rezultatas: prie vandens tinklų prisijungs 123 būstas (381 asmuo) prie nuotekų 177 būstas (549 asmenys).
9.4	Rekreacija					2014	2017	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
9.4.1	Kurortinės teritorijos statuso įteisinimas	Įteisinta kurortinė teritorija	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2014	2017	Igyvendinta	2017-02-22	Kurortinės teritorijos statusas suteiktas 2017 m. vasario 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.121

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Plėtojama ekologiško bevariklio transporto – dviračio, elektrinio paspirtuko naudojimui būtinoji infrastruktūra tarp gyvenamųjų teritorijų, skatinant kasdienes keliones atlikti alternatyviu netaršiu transportu, aktyviai leisti laisvalaikį.

Vykdomi susisiekimo kokybės gyvenamojoje aplinkoje gerinimo darbai: atnaujinama gatvių danga (Miško g.).

Vykdomi inžinerinės infrastruktūros (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) plėtros darbai, kurie užtikrins 380 asmenų vandens tiekimo ir 550 asmenų nuotekų tvarkymo paslaugas.

Kulautuvos mstl. suteiktas kurortinės teritorijos statusas.

Miestelyje optimizuojamas ir skatinamas esamos švietimo infrastruktūros objektų daugiafunkciškumas: renovavus dalį Kulautuvos pagrindinės mokyklos patalpų (atnaujinta sporto salė, kt. patalpos), užtikrintos vaikų laisvalaikio užimtumo paslaugos – įkurtas vaikų dienos centras.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Dėl inžinerinės infrastruktūros vykdomos plėtros, lėtai vyksta pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo darbai.

Nepradėta vykdyti sveikatos pirminės priežiūros paslaugų objekto – Kauno r. Pakaunės PSPC Kulautuvos ambulatorijos, plėtra ir optimizavimas, paslaugų kokybės gerinimas atnaujinant patalpas.

Nėra galutinio sprendimo dėl sveikatos priežiūros centro įrengimo vietos, nes šiuo metu centro lokalizavimo klausimas svarstymo lygmenyje.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
10	Kačerginė					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 6 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 14		
10.1	Želdynai ir rekreacija					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
10.1.1	Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams	Atskiriesiems želdynams skirtų teritorijų paėmimas	Kačerginės seniūnija	Kita		2015	2019	Vykdoma		Visuomenės poreikiams skirti numatoma 15 sklypų: rezervuoti 8 sklypai, 3 sklypams atlikti matavimai ir pateikti derinti NŽT, 1 sklypas suderintas NŽT, liko registravimo ir panaudos sutarties klausimai (Panemunė), 1 sklypui atlikti kadastriniai matavimai (Panemunė), 2 sklypai, kurių paėmimo visuomenės poreikiams procesas sustojęs, sprendžiant žemės nuosavybės klausimus
10.1.2	Kurortinės teritorijos statuso įteisinimas	Įteisinta kurortinė teritorija	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2017	Igyvendinta	2017-02-22	Kurortinės teritorijos statusas suteiktas 2017 m. vasario 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.121

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini- mo pradžia	Igyvendini- mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim- o data	Rezultato aprašymas
10.2	Socialinė infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
10.2.1	Buvusios stovyklos „Žvaigždutė“ renovacija Janonio g.65	Nugriauti avariniai pastatai, išvalyta teritorija	Verslo centras „Autosabina“ Artūras Gudas	Kita		2019	2019	Nepradėta vykdyti		Bus nugriauti avariniai pastatai, išvalyta teritorija
10.2.2	Buvusios ambulatorijos pastato renovacija Janonio g.86	Atlikta renovacija	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2017	Igyvendinta	2017-01-18	Atliktas statinio kapitalinis remontas. Deklaracija apie statybos užbaigimą, paskirties pakeitimą 2017-01-18 Nr. RPP-24-150914-00296
10.2.3	Kačerginės pagr. mokyklos renovacijos techninio projekto parengimas	Parengtas techninis projektas	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2016	2018	Igyvendinta	2018-02-27	Patvirtintas techninis projektas. Administracijos direktoriaus 2018-02-27 įsakymas Nr.409
10.2.4	Biliūno aikštės pritaikymas visuomenės poreikiams	Aikštė pritaikyta visuomenės poreikiams	Savivaldybės administracija; Seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Parengtas techninis projektas (2017 m.). Išduotas statybos leidimas
10.2.5	Stebėjimo kamerų įrengimas viešosiose vietose	Įrengtos stebėjimo kameros	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Kamerų įrengimas planuojamas 2019 m.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
10.3	Susisiekimo infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
10.3.1	Zapyškio mstl., Kačerginės ir Kauno m. jungtis, Kačerginės miestelyje J. Janonio gatvės, būsimos prieplaukos ir J. Biliūno gatvės jungtis	Įrengta dviračių tako atkarpa per Kačerginės miestelį	Savivaldybės administracija; Kačerginės seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2018	Igyvendinta		Dviračių tako atkarpa per Kačerginės miestelį įrengta
10.3.2	Dviračių tako Kačerginė – Zapyškis įrengimas	Įrengtas apie 3 km. ilgio takas	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Vykdomi dviračių tako Kačerginė-Zapyškis įrengimo darbai
10.3.3	Nemuno g. atnaujinimo darbai	Atnaujinta apie 0,4 km gatvės	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Gatvės atnaujinimo darbai nukelti 2019 m., dėl planuojamų vykdyti dujotiekio įrengimo darbų
10.3.4	J. Janonio ir J. Zikaro gatvių šaligatvių sutvarkymas	Sutvarkyta apie 2,00 km šaligatvių	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Šaligatvių J. Janonio ir J. Zikaro gatvėse sutvarkymo darbai planuojami 2019 m.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
10.4	Inžinerinė ir komunalinė infrastruktūra					2014	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
10.4.1	Vandentvarkos tinklų įrengimas, praplėtimas, sujungimas su Zapyškio mstl. tinklais, įrengti gaisrinius hidrantus, antrojo pakėlimo stotį, nuotekų valymo įrenginių įrengimas	Parengti du techniniai projektai	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2014	2014	Igyvendinta		Numatyti darbai įgyvendinti
10.4.2	Katilinių renovacija švietimo įstaigose	Renovuota Kačerginės pagr. mokyklos katilinė	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2014	2019	Vykdoma		Vykdomas naujos katilinės įrengimas
10.5	Kultūros paveldas					2015	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
10.5.1	Inžinieriaus V. Rėklaičio ir P. Vaiciuškos vilų restauravimas	Restauruotos vilos ir išsaugotas autentiškas tarpukario Lietuvos medinis paveldas Kačerginėje	Savivaldybės administracija; Seniūnija; A. Pukis	Valstybės biudžeto lėšos		2015	2018	Įgyvendinta		V. Rėklaičio vilai atliktas kapitalinis remontas (ambulatorijos pastatas) 2017 m. P.Vaiciuškos vila renovuota privačiomis lėšomis

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Vykdomas procesas teritorijų rezervavimo visuomenės poreikiams ir viešųjų erdvių plėtrai: parengti ir derinami projektai su atitinkamomis institucijomis 80 proc. visuomenės poreikiams planuojamų rezervuoti sklypų.

Kačerginės mstl. suteiktas kurortinės teritorijos statusas.

Vykdomos priemonės keliavimo alternatyviomis transporto priemonėmis skatinimui: įgyvendinti ir vykdomi susisiekimo dviračiais tinklo įrengimo darbai (keliavimui bevarikliu transportu ar elektrinėmis riedėjimo priemonėmis) miestelio viduje bei kuriant ryšius su kitomis kurortinės teritorijos statusą turinčiomis gyvenamosiomis vietovėmis (Zapyškio miesteliu);

Įgyvendinti architektūrinės, kraštovaizdžio, memorialinės vertingąsias savybes turinčių kultūros vertybių išsaugojimo darbai: restauruotos inžinieriaus Viktoro Rėklaičio ir gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Prano Vaičiūškos vilos).

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Vykdamas teritorijų visuomenės poreikiams plėtrą, procesą stabdo kliūtys, atsirandančios dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams proceso metu išskylančių žemės nuosavybės klausimų.

Nepradėti vykdyti avarinių pastatų pašalinimo darbai, išvalant teritoriją, buvusios stovyklos „Žvaigždutė“ teritorijoje (J. Janonio g. 65)

Lėtai vyksta socialinės infrastruktūros ir viešųjų laisvalaikio erdvių sutvarkymo darbai:

1. Nepradėti įgyvendinti Kačerginės pagrindinės mokyklos renovavimo darbai;
2. Neįgyvendintas Biliūno aikštės sutvarkymo techninis projektas, pritaikant Biliūno aikštę visuomenės poreikiams.

Lėtai vyksta susisiekimo infrastruktūros (gatvių, infrastruktūros susisiekimui pėsčiomis) atnaujinimo darbai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
11	Ringaudai					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
11.1	Želdynai ir rekreacija					2015	2018	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
11.1.1	Pagal Kauno r. sav. Tarybos sprendimą Nr.TS-433, 0,15 ha sklypą įtraukti (priskirti) prie Tabariškių kapinių, sklype įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.	Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė kapinių lankytojams	Savivaldybės administracija; Ringaudų seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Igyvendinta		Atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai (kadastrinis Nr. 5250/0010:1360), parengtas techninis projektas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
11.1.2	Pyplių piliakalnio ir jo prieigų sutvarkymas	Parengtas techninis projektas, pritaikyta lankymui	Savivaldybės administracija; Ringaudų seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2018	Igyvendinta	2018-11-22	Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. Atlikti piliakalnio ir aplinkos sutvarkymo darbai (darbų perdavimo-priėmimo aktas 2018-11-22)
11.2	Socialinė infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
11.2.1	Gyvenimo kokybę gerinančių objektų (lopšelio-darželio, religinės įstaigos, pirminės sveikatos priežiūros punkto, kasdienių paslaugų įstaigos) įrengimas	Įrengti 4 objektai	Savivaldybės administracija; Ringaudų seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Nepradėta vykdyti		Bus įrengti 4 objektai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
11.2.2	Kompleksinio bendruomenės centro įkūrimas.	Bus įkurtas kompleksinis bendruomenės centras	Savivaldybės administracija; Ringaudų seniūnija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2019	Nepradėta vykdyti		Bus įkurtas kompleksinis bendruomenės centras
11.3	Susisiekimo infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
11.3.1	Jurginų, Kantališkių, Graužės, Žvejų, Ateities gatvių rekonstrukcija	Rekonstruotos 5 gatvės	Savivaldybės administracija; Ringaudų seniūnija	Kita		2015	2019	Vykdoma		Atliktas kapitalinis gatvių remontas: Jurginų g., Kantališkių g., Graužės g., Žvejų g. (asfaltavimo darbai) Nepradėti vykdyti Ateities g. rekonstravimo darbai
11.3.2	Krašto kelio Nr. 140 rekonstrukcija	Rekonstruotas kelias	Savivaldybės administracija	Valstybės biudžeto lėšos		2016	2016	Igyvendinta	2016-07-13	Rekonstruotas kelias, statybos užbaigimo aktas
11.3.3	Asfaltuoti vietinės reikšmės kelius esančius Gaižėnų k. Gaižėnų g., Pyplių k. Piliakalnio g. ir Nemuno g., Ringaudų k. Vakarų g.	Išasfaltuota apie 4,65 km gatvių	Savivaldybės administracija; Ringaudų seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2016	2019	Vykdoma		Atlikti asfaltavimo darbai Piliakalnio g., Gaižėnėlių k. Nemuno g., Vakarų g. Liko atlikti asfaltavimo darbu Gaižėnų g., Piliakalnio g. (link Kamšos miško)


Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
11.3.4	Šiltnamių g. šaligatvio įrengimas iki Forto g. (apie 0,3 km), šaligatvių įrengimas Margirio, Liepų ir Pilėnų g. (apie 1,70 km)	Šaligatvių įrengimas, viso apie 2,00 km	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Rengiami šaligatvių įrengimo projektai (Šiltnamių g. šaligatvio, Margirio ir Pilėnų g. šaligatvių įrengimo projektai), lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo statybos techninis projektas. Nepradėti vykdyti darbai dėl Liepų g. šaligatvio įrengimui

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Ringaudų geografinė padėtis Kauno miesto atžvilgiu (patrauklus atstumas gyventi, dirbant Kauno mieste, patogus susisiekimo tinklas) sąlygoja spartesnius gyventojų skaičiaus augimo procesus (analizuojant 10 m. laikotarpį, gyventojų skaičius išaugo 30 proc.).

Didinama kokybinė turizmo objektų pasiūla miestelyje: turizmo skatinimui, gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimui, įgyvendinti archeologinės kultūros vertybės piliakalnio ir jo artimosios aplinkos sutvarkymo darbai.

Gerinama susisiekimo infrastruktūros kokybė: įgyvendinta 70 proc. planuotų gatvių atnaujinimo (rekonstrukcijos ar remonto) darbų.

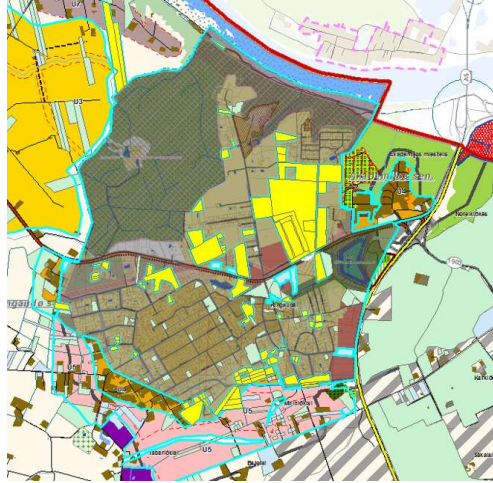

Skypai gyvenamajai statybai_Ringaudai

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nepradėta vykdyti gyvenimo kokybę gerinančių ir kultūrines paslaugas teikiančių objektų plėtra (ikimokyklinio ugdymo įstaigos, religinės įstaigos, pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, kasdienių reikmių įstaigų, bendruomenės centro plėtra), tai labai svarbu gyvenamosios vietovės gyventojų bendruomeniškumui skatinti.

Lėtai vykdomas susisiekimo pėsčiomis infrastruktūros atnaujinimo procesas: šaligatvių atnaujinimo darbai. Didesnis dėmesys skirtas ne žmogui, o jo automobiliui. Šaligatvių įrengimo projektai dar tik rengimo stadijoje (Šiltnamių, Margirio ir Pilėnų g.), kaip ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo statybos techniniai projektai, nepradėti vykdyti darbai Liepų g. šaligatvio įrengimui.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
12	Domeikava					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
12.1	Socialinė infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
12.1.1	Domeikavos poilsio parko įrengimas	Įkurta rekreacinė zona, kurioje bus įrengta lauko estrada, atvira aikštelė renginiams, teniso kortai, pėsčiųjų takas, apžvalgos aikštelė	Savivaldybės administracija; Domeikavos seniūnija	Europos Sąjungos paramos lėšos		2016	2019	Nepradėta vykdyti		Bus įkurta rekreacinė zona
12.1.2	Domeikavos gimnazijos rekonstrukcija su priestato statyba	Rekonstruota gimnazija ir pastatytas priestatas	Savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos		2015	2018	Igyvendinta		Atlikti gimnazijos rekonstravimo darbai
12.1.3	Pastato esančio Bažnyčios g. 3, Domeikavoje, Kauno r., rekonstravimas, pritaikant j Domeikavos kultūros centro veiklai	Pastatytas naujas, šiuolaikiškas laisvalaikio salės pastatas	Savivaldybės administracija	Kita		2016	2018	Igyvendinta		Pastatas rekonstruotas ir pritaikytas kultūrinei veiklai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendinim o data	Rezultato aprašymas
12.2	Susisiekimo infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
12.2.1	Aušros g. ir Plačiosios g. rekonstrukcija	Rekonstruotos gatvės	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Aušros g. įrengti lietaus nuotekų tinklai ir šaligatvis. Plačiojoje g. atlikti asfaltavimo darbai
12.2.2	Pėsčiųjų tako nuo Bažnyčios g. iki kelio Kaunas-Šėta įrengimas	Įrengta dalis pėsčiųjų tako	Savivaldybės administracija; seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Parengtas techninis projektas, sprendžiami finansavimo klausimai.
12.2.3	Domeikavos seniūnijos Pakalnės gatvės rekonstrukcija	Planuojama rekonstruoti apie 0,85 km. gatvės	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Įrengtas šaligatvis (iki Parko g.)
12.2.4	Domeikavos seniūnijos Parko gatvės rekonstrukcija	Planuojama rekonstruoti apie 1,1 km. gatvės	Savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2018	Igyvendinta		Atlikti gatvės rekonstravimo darbai
12.3	Inžinerinė infrastruktūra					2015	2019	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendini mo pradžia	Įgyvendini mo pabaiga	Statusas	Įgyvendinim o data	Rezultato aprašymas
12.3.1	Sutvarkyti tvenkinio, esančio Bažnyčios g. Domeikavos k. ir tvenkinio, esančio Eigirgailos k., aplinką	Rekreacinės zonos įrengimas	Savivaldybės administracija; seniūnija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2019	Vykdoma		Sprendžiami visuomenės prieštaravimo parko aplinkos sutvarkymui klausimai. Pradėjus įrenginėti parką, sulaukta gyventojų pasipriešinimo poilsio zonos atsiradimui, visuomenė baiminasi saugumo mažėjimo dėl prastos reputacijos asmenų būriavimosi parke.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Igyvendinti soc.infr.obj.atnaujinimo ir plėtros darbai: Domeikavos gimnazijos rekonstrukcija ir plėtra (priestatas); pastato rekonstravimo ir pritaikymo kultūrinės veiklos vykdymui darbai, Domeikavos kultūros centras, laisvalaikio salė.

Vykdomi susisiekimo infrastruktūros darbai: susisiekimui pėsčiomis – įgyvendinti Aušros g., Pakalnės g., įrengtas pėsčiųjų takas atliekami gatvių rekonstravimo, dangos atnaujinimo darbai Plačiojoje g., Parko g.

Domeikava gyv.skaičiumi auganti Kauno priemiesčio gyvenvietė, besiribojanti su Kauno m. ir įsiliejanti į miesto urbanistines struktūras bei ryšius. Miestelyje esantys ž.ū. paskirties sklypai pertvarkomi į gyvenamąją (gyv.): dominuoja (apie 40%) DP bei paskirties keitimo dok. (apie 64%), kurie rengti ž.ū. paskirties keitimui į gyv.paskirtį. Kiti kompleksinio TP dokumentai rengti esamus sklypų sujungimui/dalinimui, reglamentų nustatymui, paskirties keitimui į daugiabučių gyv.pastatų, bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijas.




Sklypai gyvenamajai statybai_Domeikava

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:


Miestelyje trūksta atskirųjų želdynų sistemos, lėtai vyksta viešųjų erdvių pritaikymas aktyvaus ir kultūrinio, pažintinio laisvalaikio skatinimui, renginių organizavimui:

1. Nepradėtas Domeikavos poilsio parko įkūrimas;
2. Sprendžiami visuomenės prieštaravimo klausimai dėl rekreacinės zonos ir aplinkos sutvarkymo prie Domeikavos tvenkinio. Pradėjus įrenginėti rekreacinę zoną, sulaukta gyventojų pasipriešinimo poilsio zonos atsiradimui: visuomenė baiminasi dėl saugumo sumažėjimo viešojoje erdveje.

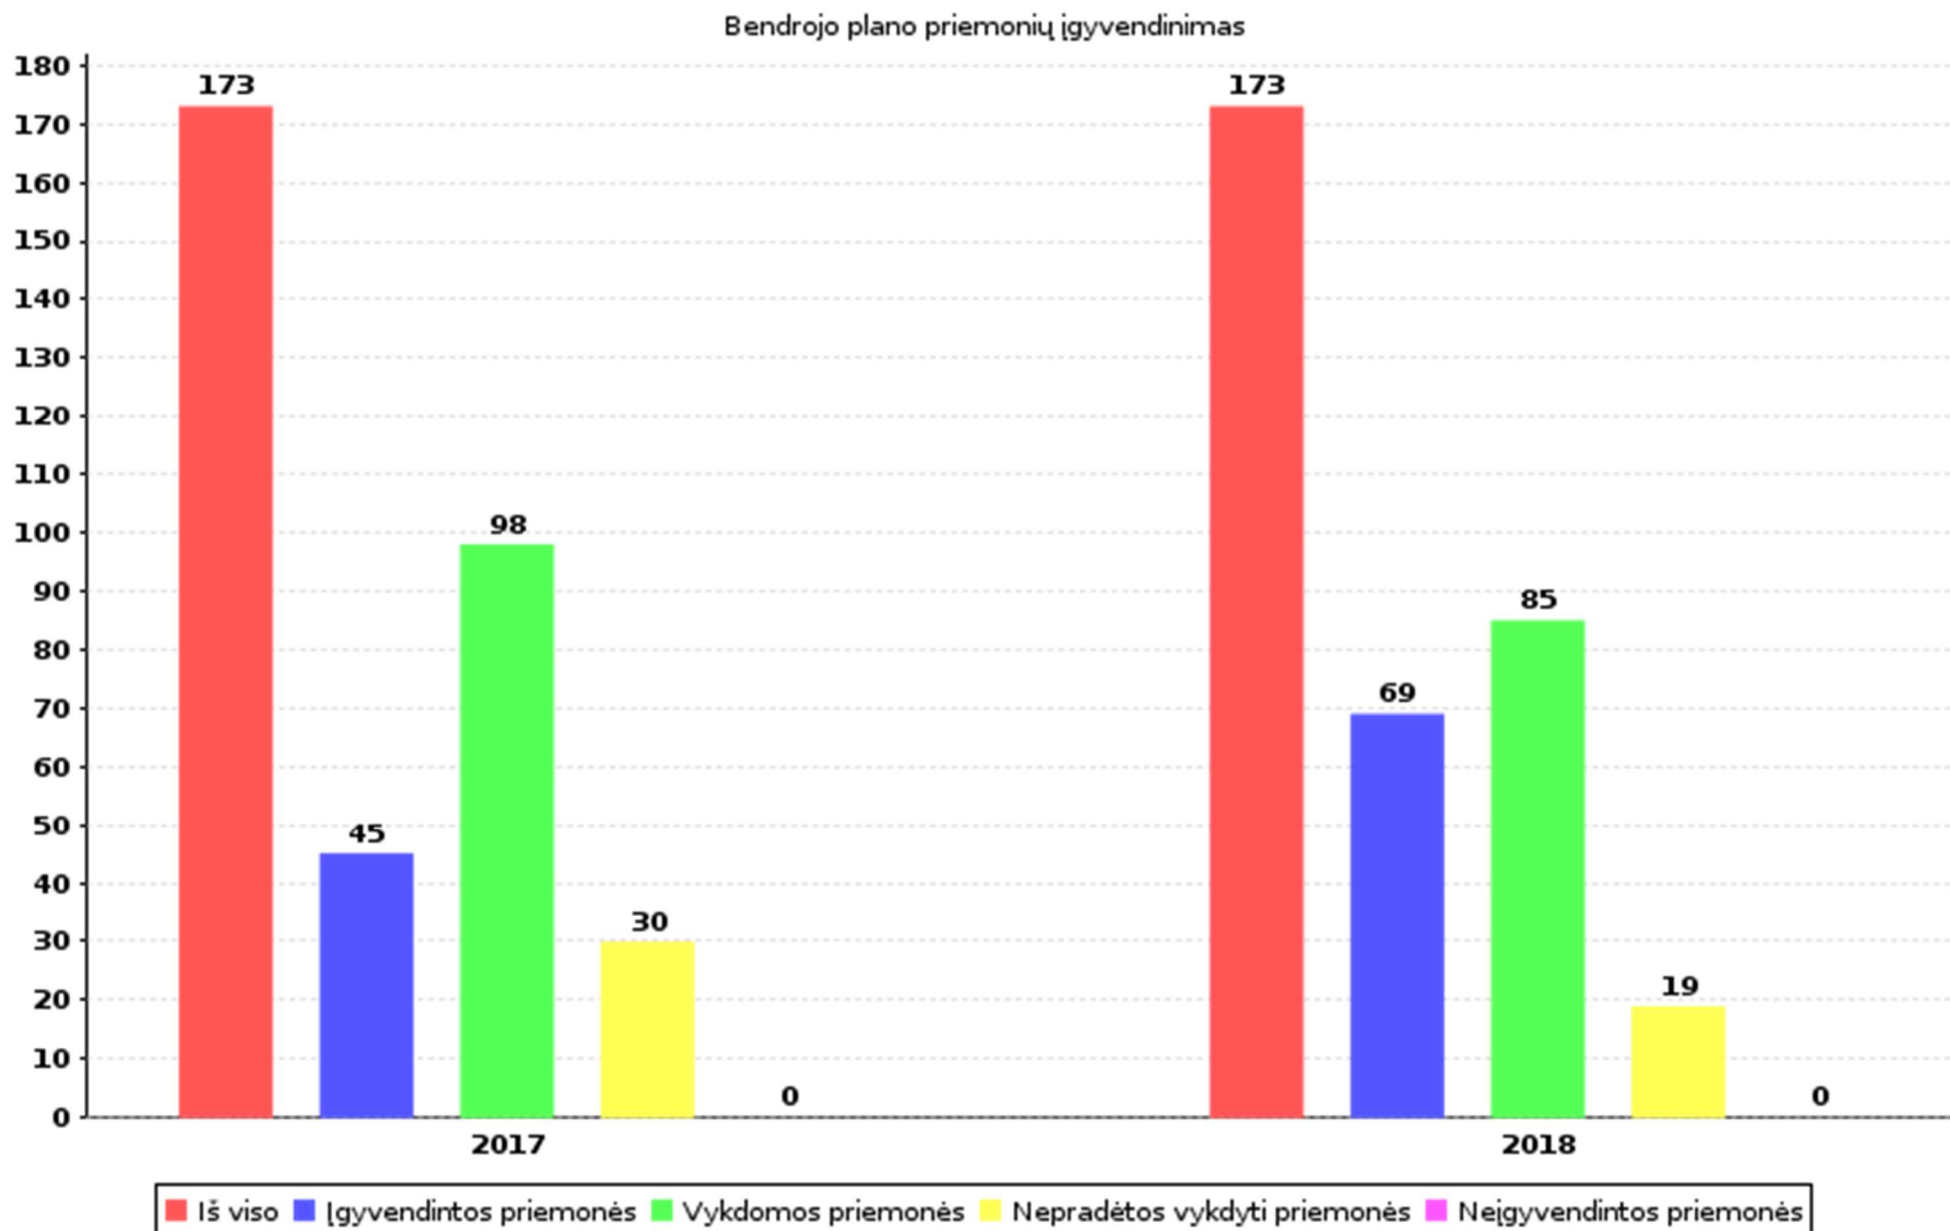


Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

Išorės aplinkos dalies sprendiniai

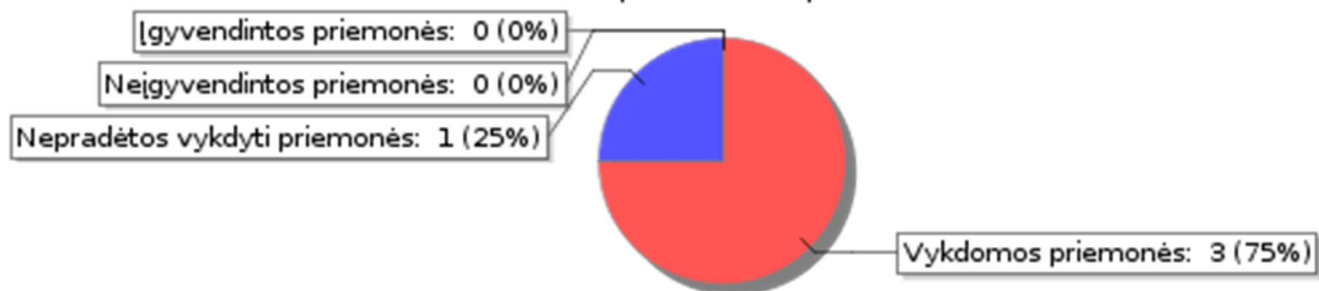


● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Urbanistinės dalies sprendiniai

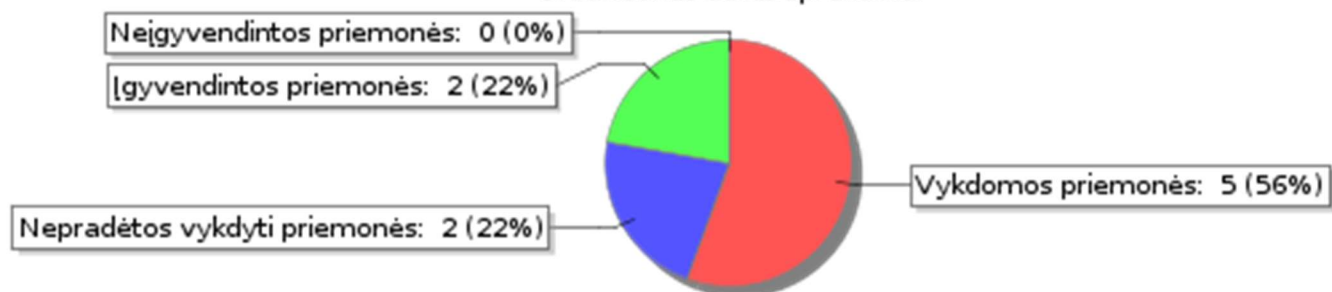


● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Gamtinės aplinkos dalies sprendiniai

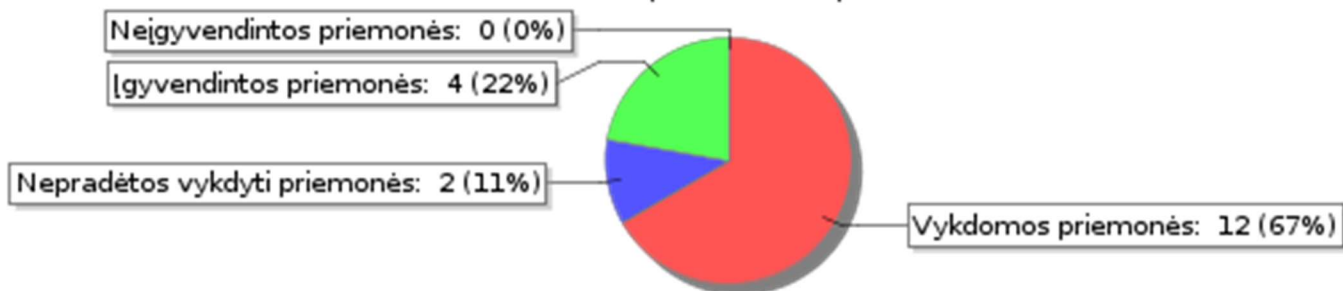


● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir naudojimas

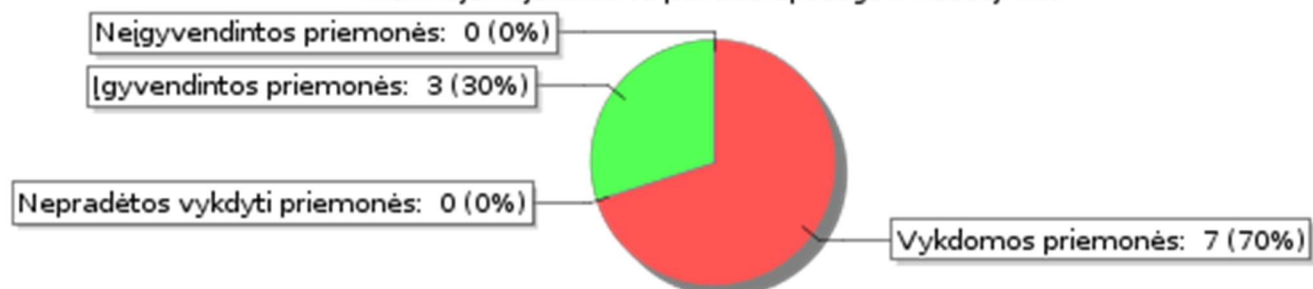


● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Socialinės aplinkos dalies sprendiniai

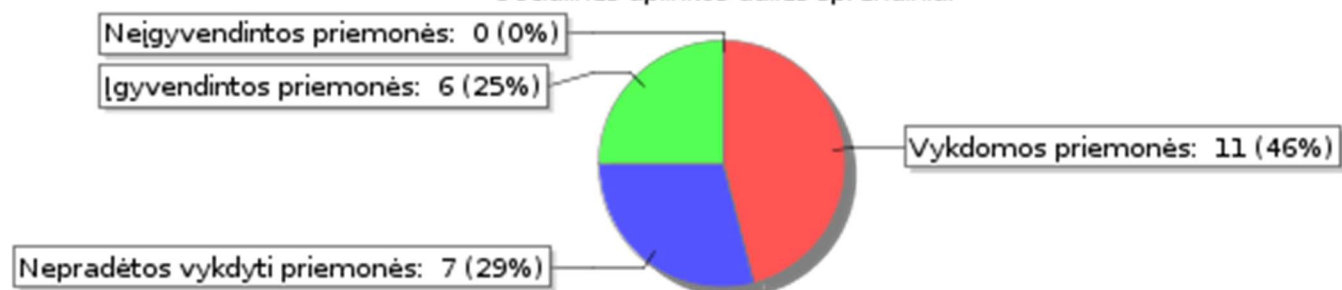


● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Susisiekimo dalies sprendiniai

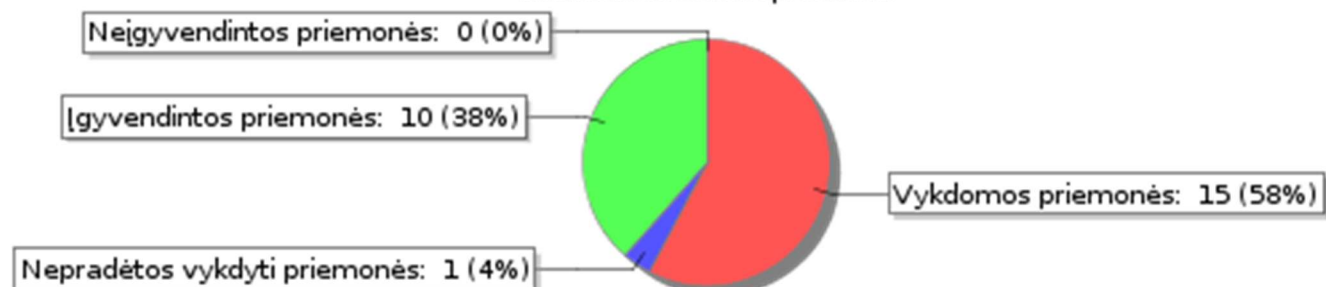


● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Techninės infrastruktūros dalies sprendiniai

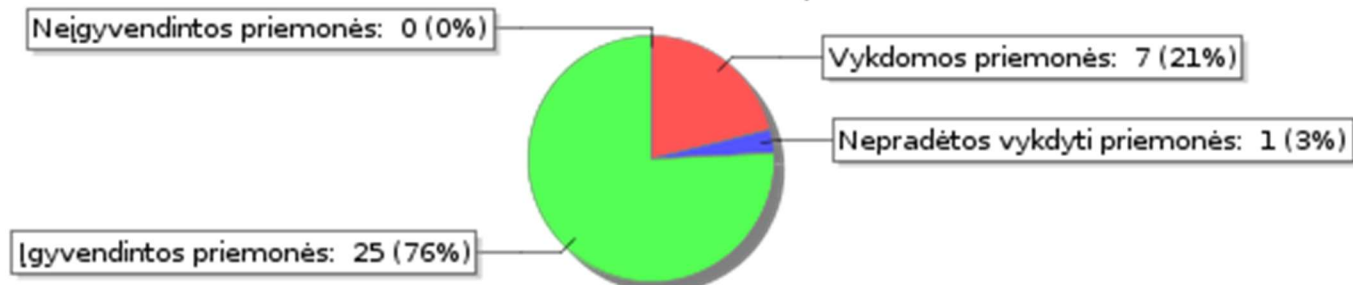


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Vilkija

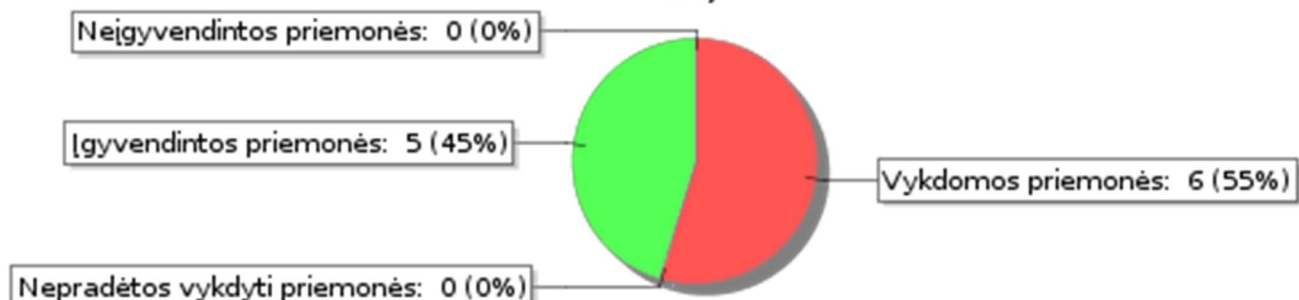


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Kulautuva

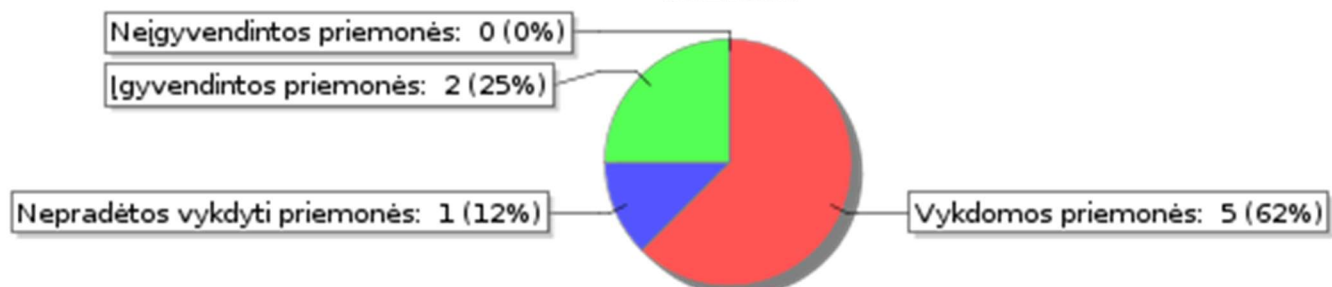

● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

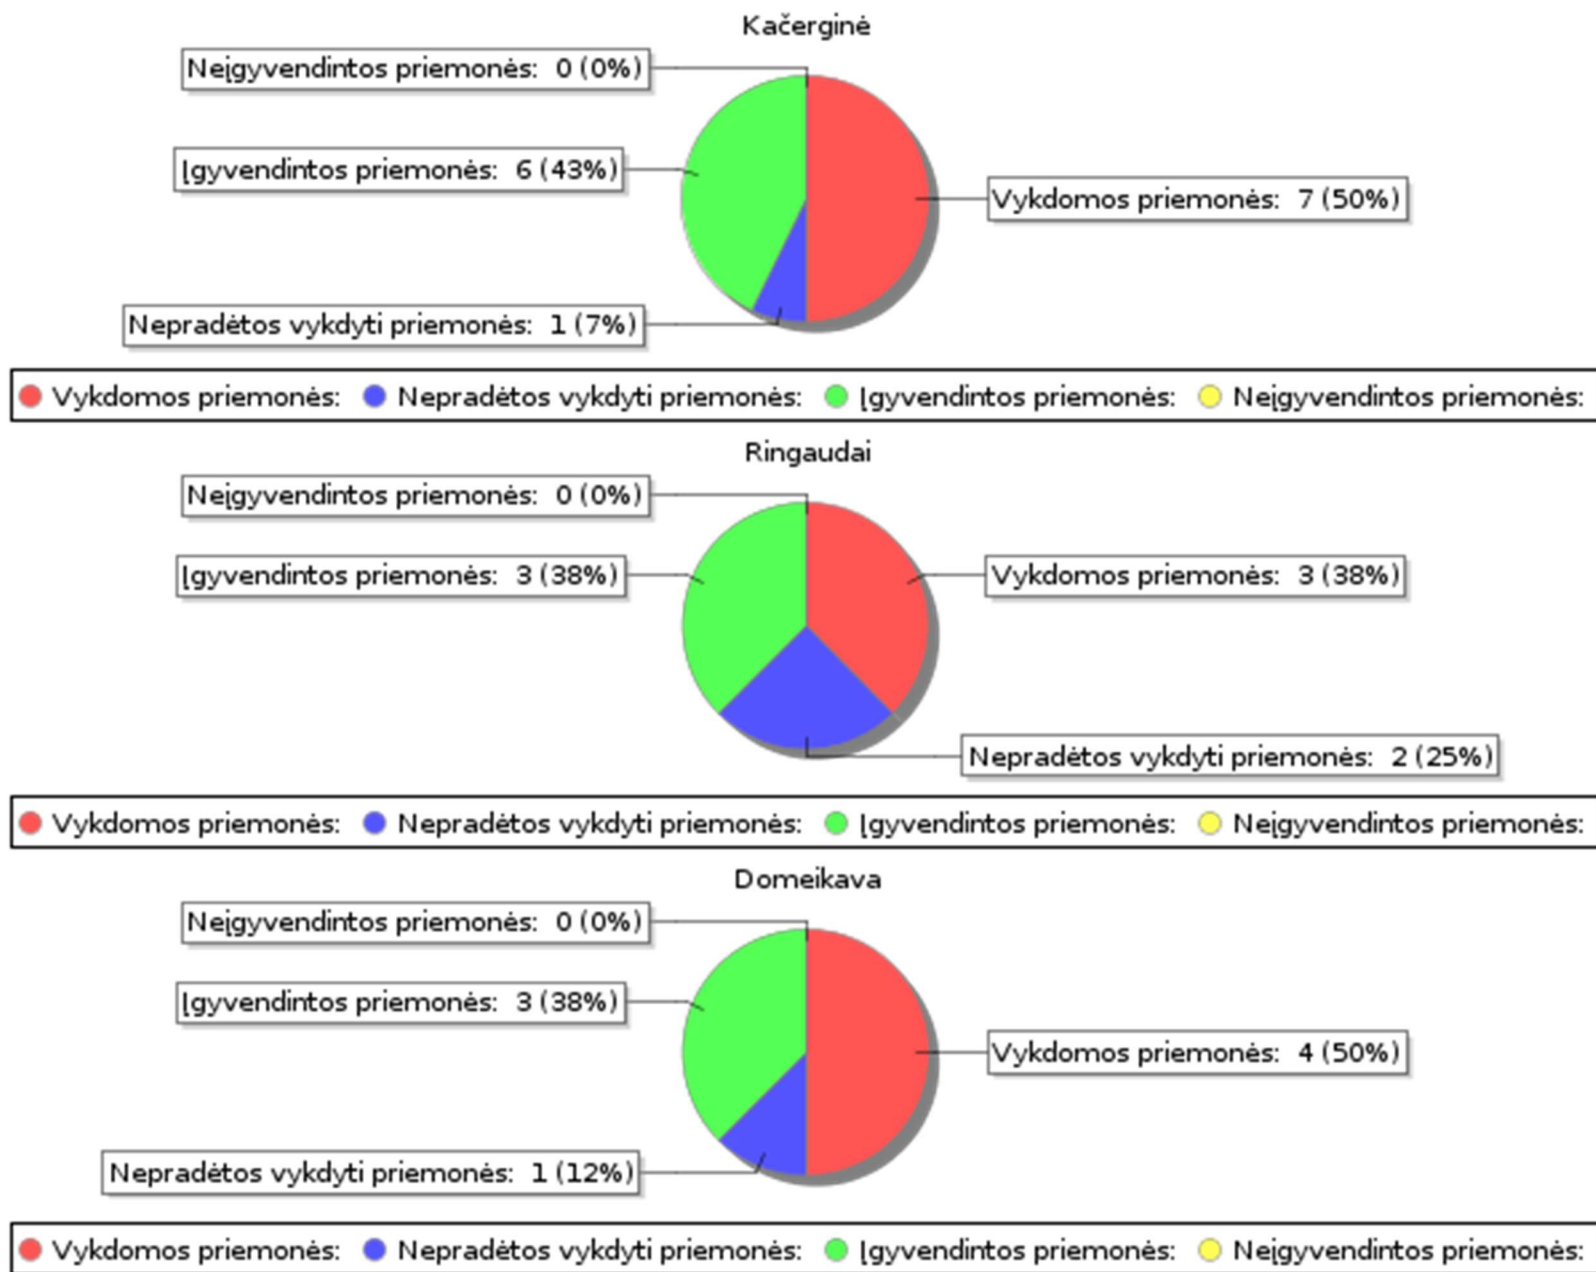

Kauno rajono bendrasis planas bei jo vėlesni keitimo ir koregavimo procesai sukūrė prielaidas darniai rajono plėtrai: pradedant nuo teritorijų urbanizavimo principinių nuostatų ir baigiant rajono specializuotų teritorijų vystymo perspektyvomis. Urbanizavimo ir teritorijų plėtros principais bendrajame plane sudarytos prielaidos kurti subalansuotą ir kasdinius poreikius atitinkančią gyvenamąją aplinką, kurioje būtų prieinami pagrindiniai socialinės infrastruktūros (švietimo ir ugdymo įstaigos, prekybos objektai ir kt. kasdinius poreikius atitinkanti infrastruktūra) bei užtikrinti pagrindiniai inžinerinės infrastruktūros

poreikiai (vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, pastatų šildymo sistemos, susisiekimo ir kt. infrastruktūra). Ekonomiškai naudingiausias teritorijų vystymo principas – kurti kompaktiškas gyvenamąsias teritorijas, kuriose mažiausiomis investicijomis būtų galimybė aprūpinti būtiniausia inžinerine infrastruktūra kiek įmanoma didesnę Kauno rajono gyventojų skaičių. Stebėsenos metu nustatyta, kad pagrindiniai rajono vystymo ir plėtros procesai buvo nukreipti į esamos mokymosi aplinkos, gyvenamosios aplinkos sąlygų bei susisiekimo kokybės gerinimą, alternatyvaus mobilumo skatinimą (dviračių takų plėtrą), gyventojų užimtumo skatinimą, gyventojų (turinčių poreikį socialinio būsto nuomai) aprūpinimą socialiniu būstu, esamų infrastruktūrinių objektų optimizavimą ir panaudojimą (policijos pastatas Garliavos m. pritaikytas ikimokyklinio ugdymo reikmėms; vaikų darželis įrengtas A. Stulginskio universiteto bendrabučio patalpose), rekonstruotas ir socialiniam būstui pritaikytas buvęs vaikų darželio pastatas). Tačiau lėtai vyksta viešųjų laisvalaikio erdvių (žaidimų aikštelių) sutvarkymo ir saugos jose didinimo procesas esamose gyvenamosiose erdvėse.

Nors ankstesniais metais dviračių takų plėtra buvo labiau susieta su turizmo sektoriumi ir nukreipta į rekreacinių poreikių tenkinimą (jungtys su kurortinės teritorijos statusą turinčiomis gyvenamosiomis vietovėmis Kulautuvos, Kačerginės mstl.), tačiau pastaraisiais metais plėtra vykdoma siekiant užtikrinti kasdienių kelionių poreikį (dviračių takų plėtra Karmėlavoje, Garliavos jungtis su Kauno m., jungtis link Karmėlavos mstl.) ir mažinant esamo susisiekimo dviračiais tinklo fragmentiškumą.

Analizuojant dokumentų, numatančių urbanizavimo procesus, apimtis, įgyvendinant Kauno rajono bendrojo plano sprendinius, didžiausia dalimi tvirtintų dokumentų (apie 70 proc.) siekiama numatyti gyvenamąją paskirtį ir, didžiąja dalimi, techninės infrastruktūros požiūriu neišvystytose teritorijose: 73 proc. dokumentais gyvenamai paskirčiai skirtą ploto įsisavinama ne esamose, o naujose plėtros teritorijose. Analizuojant urbanizuojamų teritorijų plėtros tendencijas ir bendrojo plano sprendiniuose numatytas plėtros teritorijas, orientuotas į priemiestinę Kauno miesto atžvilgiu plėtrą, stebimas perteklinis plėtros teritorijų potencialas U3 (naujos gyvenamosios teritorijos su vietiniais (daugiafunkciniais) centrais) teritorijose. U3 teritorijoje atliekant detaliųjų planų ir sklypų paskirčių keitimo dokumentų analizę ir stebėseną, detaliaisiais planais (nuo bendrojo plano gyvavimo pradžios iki 2017 m. pab.) ir paskirčių keitimo dokumentais (2014-2018 metų laikotarpiu) įsisavinta tik penktadalis U3 naujos plėtros teritorijų: atitinkamai 17 proc. ir paskirčių keitimo dokumentais 2 proc. naujos plėtros teritorijų ploto. Esant dabatinei situacijai ir sklypų fragmentiniam išsibarstymui, aprūpinti gyventojus inžineriniais ir susisiekimo infrastruktūros tinklais beveik 1670 ha ploto plėtros teritorijoje reikiamų investicijų prasme nėra realu. Todėl siūloma peržvelgti ir kompaktizuoti U3 plėtros teritorijų ribas, plėtrą planuojant bendruoju planu numatomose plėtoti arčiausiai linijinės inžinerinės infrastruktūros esančiose teritorijose arba racionalizuoti U3 plėtros teritorijas numatant ne plėtros galimybes laike, bet plėtros galimybes stebint įgyvendinimo lygį bei nustatant plėtros etapiškumą. Pvz. nustatyti U3 plėtros teritorijos suskaidymą plėtros etapais ir urbanizavus I plėtros etapo teritorijos dalį (pvz. 80 proc.), tik tuomet vykdyti U3 teritorijos tolimesnio etapo plėtrą.

Kadangi virš 70 proc. detaliųjų planų ar paskirties keitimo dokumentų susiję su teritorijomis gyvenamosios paskirties pastatų statybai, darnios plėtros užtikrinimui U3 plėtojamose teritorijose siūloma iš anksto įvertinti teritorijos poreikį socialinės, rekreacinės ir kt. būtiniosios infrastruktūros plėtrai, mažinant asmeninio transporto naudojimo būtinybę.

Besiklostant šalies gyventojų vidinės migracijos (vykstant gyventojų kėlimuisi į priemiesčius) bei miestų skydimo tendencijoms į priemiesčius, bendrajame plane svarbia transporto sektoriaus dalimi siūloma išskirti viešojo transporto paslaugos dalį, kaip regioninę priemonę miesto ir rajono viešojo transporto sąveikai skatinti ir užtikrinti savivaldybių partnerystę vykdant keleivių vežimą. Siekiant išvengti papildomų automobilių srautų generavimo tiek rajono, tiek miesto teritorijose ir įgyvendinant Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos vieną iš tikslų – skatinti vietinio (miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą, Kauno rajono gyventojų mobilumo įpročius siūloma spręsti ne tik miesto ir priemiesčio viešojo transporto maršrutų suderinamumo ir didesnės jų sąveikos skatinimu, bet ir vieningo bilieto sistemos kūrimu.

Pastarųjų 2 metų eigoje gyvenamosiose teritorijos buvo sparčiai tvarkoma susisiekimui skirta infrastruktūra, tačiau labiau orientuotasi į kelionių automobiliais gerinimo sąlygas. Vietinio susisiekimo darnaus judumo požiūriu (kelionėms pėsčiomis, dviračiais, populiarijantiems elektriniams paspirtukais) sąlygų gerinimui buvo skirtas mažesnis dėmesys ir sparta.

III. Prognozės

Esant dabartinėms gyventojų skaičiaus augimo tendencijoms galima prognozuoti vidutinį 1400-1500 gyventojų kasmetinį prieaugį. Susidarius prognozuojamo gyventojų prieaugio rajone aplinkybėms, vertinant 2014-2018 metų teritorijų plėtros tendencijas U3 teritorijoje, teoriškai 10 metų bėgyje galima prognozuoti papildomą 30 proc. U3 plėtros teritorijų įsisavinimą, kas visumoje sudarytų iki 50 proc. teritorijų užpildymo. Tačiau prognozės negali būti vertinamos besąlygiškai, nes plėtros tendencijos priklauso nuo ekonominių ir kitų aplinkybių, kurios skatina įvairius procesus (gyventojų poreikius, užimtumą, vidinės ir išorinės migracijos situaciją) šalyje. Taip pat labai svarbu stebėti faktinį dokumentų įgyvendinimą: ne tik dokumentaciją, bet ir fizines užstatymo aplinkybes, vertinant teritorijų įsisavinimo faktą.

Esant prognozuojamiems priemiesčių apgyvendinimo procesams, ir vertinant tai, kad daugiausiai keliai jauni darbingo amžiaus gyventojai, itin svarbu užtikrinti būtiną socialinės infrastruktūros poreikius ir alternatyvių keliavimo būdų priemonių diegimą (viešojo transporto efektyvumą, bevariklio transporto naudojimui ir eismo saugai reikiamą infrastruktūros plėtrą, multimodalinių kelionių skatinimą, sudarant galimybes gyventojams keisti asmenines transporto priemones į alternatyviasias), priešingu atveju galima prognozuoti automobilių eismo intensyvėjimą ir tiesioginę jo įtaką eismo įvykių neigiamoms tendencijoms.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Kauno rajono bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos apimtyje situacija visapusiškai įvertinama per priemonių plane numatytų priemonių fizines įgyvendinimo aplinkybes, bet ne kokybines, dėl tai nusakančių rodiklių trūkumo.

Siekiant kokybiškos gyvenamųjų teritorijų plėtros, būtina vykdyti: gyvenamųjų teritorijų kompaktiškumo stebėseną, gyventojų skaičiaus gyvenamosiose vietovėse kaitos bei amžiaus aplinkybių tendencijų analizę, darbo vietų skaičiaus pokyčių analizę.

Būtina sudaryti prielaidas išlaikyti fizinę galimybę ir ekonomiškai bei aplinkosaugos prasme geriausius rezultatus, aprūpinant gyventojus centralizuotais inžineriniais tinklais bei susisiekimo infrastruktūra, skiriant didelį dėmesį vietinio susisiekimo tikslams (pėsčiųjų ir susisiekimo bevariklėmis, kt. riedėjimo priemonėmis infrastruktūra), gyvenamojoje aplinkoje kurti reikiamą socialinės infrastruktūros gerovę bei skatinti darnaus judumo principus.

Lygiagrečiai su gyventojų skaičiaus gyvenamosiose teritorijose augimu, būtina analizuoti socialinės ir techninės infrastruktūros poreikį. Šiuo metu galiojančios teritorijų planavimo normos neapibrėžia bendrojo lavinimo mokyklų pasiekiamumo spindulio, kas iš dalies apsunkina įvertinimo galimybę ar yra tenkinamas mokyklų poreikis rajone, tačiau netolygų mokyklų išnaudojimą taip pat skatina skirtinga gyvenviečių augimo sparta.

Svarbu analizuoti įvairių įgyvendintų priemonių naudą, vykdant apklausas, tyrimus:

gyventojų mobilumo įpročių keitimąsi, ypač aktualūs priemiestinių teritorijų gyventojų mobilumo įpročiai;

kurortinės teritorijos gyvybingumo, lankomumo pokyčius;

turizmui pritaikytų gamtos ir kultūros paveldo objektų lankomumo pokyčius;

vietinių viešųjų erdvių lankomumą ir kt. faktus, nusakančius priemonių efektyvumą.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

-

Dėl bendrojo plano keitimo:

Kauno rajono Bendrasis planas (parengtas 2009 m. ir 2014 m. patvirtintas I-asis Kauno r. savivaldybės teritorijos Bendrojo plano pakeitimas) atliko teigiamą vaidmenį valdant investicijas 2009-2018 m. laikotarpiu, tačiau būtina įvertinti aplinkybę, kad, 2018 metais pasibaigus Bendrojo plano sprendinių galiojimui, savivaldybės teritorijoje nebelieka galiojančio kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, kas sudaro prielaidas chaotiškai, nevaldomai teritorijų plėtrai. Atlikus stebėseną siūloma:

1. Užtikrinti esamų Bendrojo plano sprendinių galiojimo tęstinumą. Esant dabartinėms U3 teritorijų įsisavinimo aplinkybėms siūloma pratęsti galiojančio Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių galiojimą ir plėtros teritorijų U2, U3 ir U4 (galiojusias laikotarpiui iki 2019 m.) vystymo sąlygas, kol bus parengtas ir patvirtintas naujas Kauno rajono bendrasis planas (pakeitimas).

2. Palikti galioti iki 2019 m. siūlytas vystymo sąlygas plėtros teritorijoms U5, U6, kol bus parengtas ir patvirtintas naujas Kauno rajono bendrasis planas

(pakeitimas), kuriame bus racionalizuotos plėtros teritorijos.

3. Dėl aukščiau įvardintų aplinkybių, siūloma stabdyti bendrojo plano koregavimo procesą TPD Nr. K-RJ-52-16-281 pagal 2016 m. birželio 21d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. ĮS-1193 bei pradėti bendrojo plano keitimą. Pridedamas Planavimo programos projektas.

4. Keičiant bendrojo plano sprendinius, peržvelgti ir kompaktizuoti U3 plėtros teritorijų ribas, atsižvelgiant į galiojančio bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendinius, arba racionalizuoti U3 plėtros teritorijas numatant ne plėtros galimybes laike, bet plėtros galimybes stebint įgyvendinimo lygį bei nustatant plėtros etapiškumą.

5. Patikslinti plėtros teritorijas, analizuojant potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius, įvertinant situaciją pagal tikimybinės potvynių charakteristikas: ypač atkreipiant dėmesį į didelės tikimybės potvynių teritorijas (10 proc. tikimybės potvynis, kai remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių pačių charakteristikų potvyniai gali pasikartoti vieną kartą per dešimt metų) ir atitinkamai priimti prevencinius sprendimus šių teritorijų urbanizavimui.

6. Integruoti 2015 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-703 patvirtintą Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planą, keičiant galiojančio bendrojo plano sprendinius, kurie atitiktų kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo principus ir nuostatas:

6.1 nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal svarbiausius Kauno rajono teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo sritis;

6.2 sudaryti prielaidas siekti bendrosios struktūros optimalumo rodiklių (nustatyti tikslinius formuojamo kraštovaizdžio bendrosios teritorinės struktūros kokybės rodiklius);

6.3 stiprinti gamtinį karkasą ir ekologinę pusiausvyrą (nustatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinių ir kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą);

6.4 nustatyti priemones kraštovaizdžio kultūrinio identiteto saugojimui;

6.5 Kraštovaizdžio plano sprendiniai yra prioritetiniai priimant ūkinės plėtros (pvz., inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra ir kt.) galimybių kraštovaizdžio požiūriu sprendimus.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Kiti siūlymai:

Keičiant Kauno rajono bendrąjį planą, būtina įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Kauno rajono savivaldybės tarybos patikslintų planų sprendiniai turėtų būti integruoti į keičiamą bendrąjį planą. Esant svarbiems argumentams ir esminiems prieštaravimams bei neatitikimams bendrojo plano planavimo tikslams, neintegruotinų galiojančių Kauno rajono specialiųjų planų galiojimas turėtų būti naikinamas ir tokie planai išregistruojami iš Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) arba rengiami specialiųjų planų pakeitimai.

V. Priedai:

Rodiklių informacija
